

Juli 2019

20 Juli 2019



Nadat vorige maand de isolatie in de spouwmuur was afgekeurd is er door de takkengroep de isolatie bij gespoten met wit schuim dat alle korrels weer moet gaan hechten.





Helaas is er door het spuiten de binnenmuur geschuurd dit zou volgens takkengroep komen dat deze niet is geankerd met de buitenmuur en de lijm niet juist zou zijn. Bij dit antwoord zet ik mijn vraagtekens ???????



De stenen van de oprit zijn bij de voordeur bijgeslepen en opnieuw gelegd zodat alles nu netjes uit ziet



Het midden terras is dinsdag 25 juni op het slijpen van enkele stenen gelegd




Het onderste terras is woensdag 26 Juni het zand ingelegd en klaargemaakt zodat dit de dag erna kan worden gelegd.



Bij alle plantenbakken zijn de extra muurtjes aan de achterzijde opgevuld met tempex en netjes afgewerkt aan de bovenzijde



Het onderste terras is nu gelegd en alles is bijgeslepen

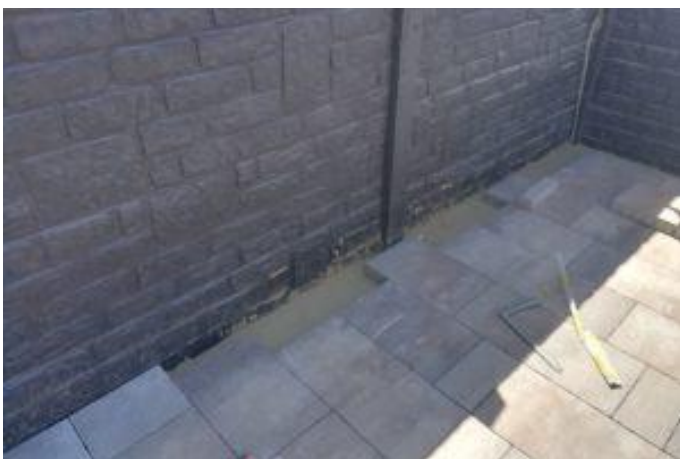



Nu alle externe werklui weg zijn tijdelijk enkele pallets voor de achteringang gemaakt zodat de AVG 2018 weer van kracht is



Omdat de terrassen niet in wildverband zijn gelegd is er nog ruim 3 kwart pallet over deze stenen netjes opgestapeld in de garage voor het toekomstige wildverband.



Inmiddels wat aanpassingen aan de bloembakken gedaan en de trap zodat het oog er niet op valt



Ook fase 4 is afgerond. De bloembak in de voortuin is een feit





Het puntstuk uitgegraven en onder de plantenbakken wat versterking aangebracht omdat de grond aan de onderzijde er onderuit valt.



Het leveren van 4 kuub teelaarde en het eindresultaat





De laatste stukken geharst zodat de bakken helemaal klaar zijn



De dorpel voor de achterdeur is inmiddels opgehaald en netjes op zijn plek waterpas gelegd
Het kozijn is inmiddels ook al voor de maat los op de plek gezet



Na wat aanpassingen boven de garagepoort is de lamp met sensor ook geplaatst



Nu de bloembakken zijn gevuld met teelaarde en de kiezel ligt zijn inmiddels ook de eerste planten en struiken gezet en ook het waterornament is geplaatst.





In de keuken is inmiddels 1 raam al een gedeelte folie geplakt voor tegen de inkijk



In het keldergat zijn de geslepen stenen gelegd en gevoegd nu nog laten uitharden en weer een opbergruimte gecreëerd.

