

Mei 2019

18 Mei 2019



Inmiddels zijn de rolluiken weer netjes opgehangen.


De nieuwe deurbel met camera is geïnstalleerd en in gebruik genomen.

De trap bij de voordeur is op het voegen na klaar ook de zijkanten zijn met steentjes bijgemaakt





Het keizelbeton rond om de voordeur heeft al een mooi grijs kleurtje gekregen voor 3 kwart voor de rest was geen verf meer. De verf wordt nu op kleur gemaakt en volgende week zal de rest worden geschilderd

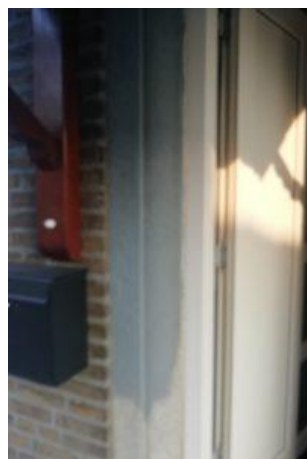

Ook is er weer een nieuwe partij stenen die moet worden schoongemaakt met staalborstels. Deze komen bij de trap die nu ruim 30 cm minder breed is geworden.



De dakkapel is weer de rand helemaal opnieuw geschilderd.



In de kelder is er een nieuw ventilatiegat gemaakt vanuit de kruipruimte.



De kabels en de staalkabels zijn nu in de achtertuin allemaal getrokken en zodra de tuin klaar is kan de staalkabel worden vervangen door het druppelsysteem.



Vandaag begonnen met het leegmaken van de achtertuin zodat Tuin klussen bedrijf Leon kan beginnen met het maken van de achtertuin



