

Februari 2017

4 Februari 2017

Deze week maar met 1 klus bezig gehouden dus er hoeft niet veel te worden geschreven vandaag

Voor de 2de week achter het aanrecht gestaan in de keuken niet om te koken maar verder met het tegelen van de achterwand en het plaatsen van de nieuwe zilverkleurige stopcontacten. Nog 4 stukken tegels snijden en lijmen komende week daarna de afwerkstripjes zagen en plaatsen en als laatste voegen






11 februari 2017

deze week de laatste tegels gezet in de keuken en de afwerkstripjes geplaatst en gevoegd op een paar stripjes na is de keuken weer een stukje meer klaar voor gebruik





op de toilet is uiteindelijk de plafond gerepareerd maar ziet er niet uit dus zodra ik elders met de plafonds ga beginnen zal hier ook een andere plafond in komen

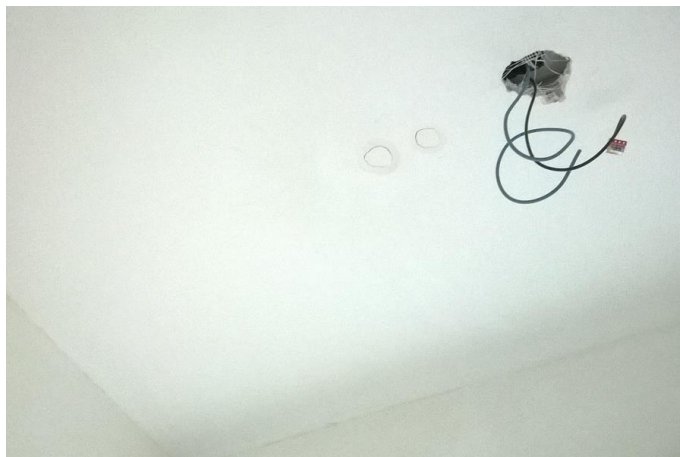

Ook enkel afwerkstripjes op het toilet ingefreesd om alles wat mooier af te werken. Komende week verder met het afwerken van de toilet met wat stripjes en het plaatsen van de vensterbank die met wat kap en frees werk er mooi in gaat passen



Om diverse deuren afwerklatjes geplaatst



De deur van de meterkast afgehangen



De laatste elektrabuizen vastgezet in de bijbouw



De eerste tegels in de kelder zijn inmiddels ook al gelegd Het zal een grote klus worden want nu blijkt dat de tegels diverse diktes hebben en niet even groot om er toch nog iets moois van te kunnen gaan maken



19 Februari 2017

De lamp in de toilet op de begane grond is opgehangen de bijgemaakte gaten zijn helaas nog steeds zichtbaar dus zoals ook vorige week aangegeven komt er een nieuwe plafond erin.



ook zijn de rest van de afwerkstripjes boven de tegels vastgezet zodat het nu mooi is afgewerkt



Met een freesmachine en een houtbeitel te werk gaan en de vensterbank kan er mooi waterpas in worden gelegd. Ondanks dat er werd aangegeven dat het niet mogelijk was is het dus toch mooi gelukt wel een middagje werk maar is het wel zoals het hoort te zijn



Tijdens het plaatsen van de vensterbank van binnenuit onder het raam gepurd omdat er wind door kwam omdat het open profielen zijn van het raam. Alleen kwam de pur er aan de buitenzijde uit omdat de onderkant van het kozijn is dicht gekit



De laatste afwerkprofielen in de keuken zijn ook vastgemaakt



Het zonnetje scheen lekker deze week en het begon te kriebelen om buitenwerk te gaan doen. Dus het eerste begin gemaakt om de laatste boomstronk uit te gaan graven maar na 10 minuten gestopt omdat het zonnetje te lekker was om in te werken



Omdat het grootste gedeelte nu klaar is voor de stukadoor en in die ruimtes even niet verder kan Een begin gemaakt met het isoleren van de bijbouw met pir en tempex platen. Om toch iets te doen Na wat tieren en vloeken en een nachtje geslapen is het vandaag wat beter verlopen en een gedeelte klaar




24 Februari 2017

In verband met Carnaval het bericht een dagje eerder

Vandaag is de poetsploeg al geweest in plaats van de normale zaterdagmorgen



Deze week verder gegaan met het isoleren van de bijbouw helaas niet helemaal af gekomen dus zal er na de carnaval verder worden geïsoleerd

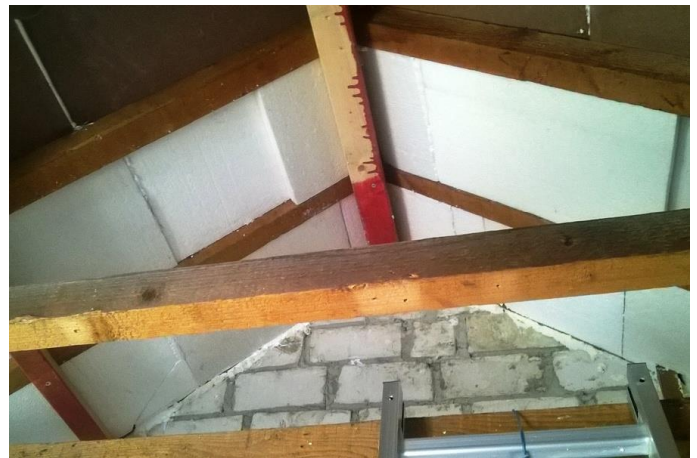

In de kelder ook weer een stuk ingesopt met hechtmiddel voor verder te gaan met tegelen

