

Juni 2017

3 Juni 2017

Deze week de groenten tuin uitgebreid met een tomaten- en komkommerplant



Aan de buitenkant de riolering van de keuken aangesloten en de muur weer dicht gemaakt nu alleen nog het lek onder de aanrecht proberen dicht te krijgen



Weer een gedeelte van de keldervloer getegeld het stuk onder de trap is nu ook klaar en gevoegd. Nog 22 hele tegels en daarna nog 63 tegels op maat maken dan kan ook dit klusje van de lijst af worden gestreept



Er begint stilaan nu een doorgang te komen vanuit de kelder naar buiten toe voor het leggen van een 80 mm buis> De eerste 12 cm zijn klaar nog 25 cm te gaan. Maar zoals men zegt aan het eind van de tunnel is het licht en de eerste 2 lichtpuntjes zijn er al



In de kelder is inmiddels ook al een gedeelte van de toekomstige voorraad rek opgezet. Nu even in gebruik voor de machines voor het maken van het gat



Ook in de kamer is er weer wat gebeurd zo is de gipsplaat boven de voormalige schoorsteen vast gezet en de laatste balk in de woonkamer weggehaald zodat deze kan worden gebruikt om de andere balken te verlengen bij de voormalige schoorsteen en ijzerenbalk boven de bar



10 Juni 2017

De extra dunne spotjes voor boven de bar die ik besteld had zijn deze week binnengekomen en direct maar de gaten gemaakt en aangesloten. Alleen kunnen ze nog niet erin worden gezet omdat de stucadoor de balk nog moet stucen.



De plafondbalken bij de keuken en oude schoorsteen verlengt



Sinds vorige week nog een lek ontdekt in de afvoer van de keuken deze week al 2x geprobeerd met lijm het dicht te krijgen. morgen nogmaals kijken of het nog lekt anders moet de loodgieter maar terug komen en het probleem oplossen



Deze week op een andere lokatie aan een nieuw project begonnen. Het aanleggen van een kiezelstrand. In totaal waren 6000 kg kiezel geleverd voor aan de straat en moesten met kruiwagens achter in de tuin komen. De nieuwsgierigheid in de buurt is enorm. En opzichters genoeg maar nog niet 1 kiezeltje hulp.




16 Juni 2017

Deze week een kort weekje daarom ook een dagje eerder een berichtje dan standaard op Zaterdag

Na heel wat uurtjes in de kelder te hebben doorgebracht met de boormachines, klophamer, beitels en andere sloopgereedschap uiteindelijk toch door de 37 cm dikke fundering heen gekomen voor de 80 mm buis richting garage



Nu het gat is gemaakt kan een groot gedeelte van de sleuf worden dicht gemaakt en is de oprit weer vrij

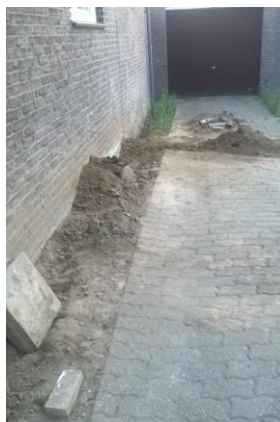

Ook het gedeelte van de keukenafvoer is nu weer netjes bijgevoegd



Nu nog het gat aan de andere kant van de buis maken in de garage. Daar is inmiddels ook al een begin aan gemaakt



In de bijbouw uitgemeten waar de afvoer van de wasmachine moet komen en het eerste kleine gat gemaakt in de muur. Nu kan ook hier aan worden gewerkt




24 Juni 2017

Deze week een tropenrooster gemaakt en om 3 uur lekker in het zwembad te liggen. (Werkoverleg voor de komende maand)

Maandag enkele aanhangers stenen gehaald in Obbicht om de oprit wat breder te maken. In verband met het zonnige droge weer ook maar gelijk eraan begonnen na heel wat zweet druppels liggen de stenen erin tot aan de voordeur. Naar achter richting garage wordt later als er weer stenen zijn

bijgelegd. Voordat er een hoop mails binnen komen zal ik het al zeggen Nee er ligt geen zandbed onder en het ligt niet waterpas dit is maar tijdelijk

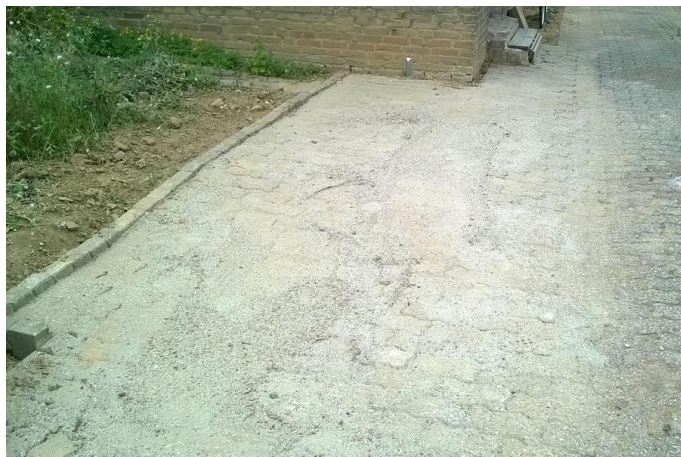

Ook deze week even wat verkoeling opgezocht in de kelder en weer een gedeelte tegels gelegd tot de lijm op was. Weer iets voor op het winkellijstje te zetten TEGELLIJM



Een extra kabel bijgetrokken vanaf de kelder richting controlelampje. Binnenkort wordt dit aangesloten zodat er vanaf de keuken kan worden gezien of het licht in de kelder brandt

