

September 2017

2 September 2017

Deze week de Nederlandse en Belgische economie een injectie gegeven en enkele opdrachten uitgegeven aan derden. In de komende maanden zullen deze worden uitgevoerd

De hele aardappelveld is geroid en droog binnengehaal



Deze week een extra raggelwerk in de keuken gezet en de hdm plafondplaten in de smalle kant geplaatst.






De lamp in de keuken opgehangen en getest. Daarna de stroom weer uitgezet om de rest van de lampen in te zetten. Helaas slaat de groep nu steeds uit en klopt er iets niet komende week komt de electricien kijken wat er gaande is



De afzuigkap ook even opgehangen om te kijken of er hoog genoeg is getegeld. En ja hoor op de millimeter goed getegeld Weer een pluimpje voor me zelf verdient



Na maanden steeds tegen een gat te hebben aangekeken dat niet netjes is bijgemaakt vandaag wat stuc gemaakt en bijgewerkt nu moet het nog wat meer drogen maar het is bijna niet meer zichtbaar en hoeft er hopelijk geen nieuwe plafond meer in de toilet worden gemaakt

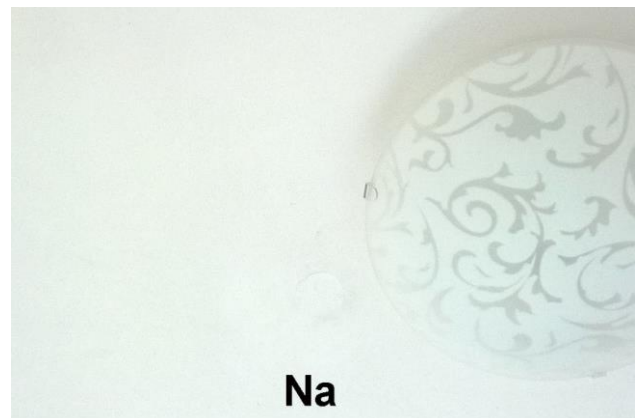

In de garage het wasbakje weer opgehangen en de afvoer waterdicht gemaakt. Het is alleen nog niet getest of het nu helemaal waterdicht is maar heb er wel vertrouwen in dat dit ook goed komt




Het nieuwe raggelwerk op de slaapkamer moet komende week voorzichtig worden losgemaakt en het oude raggelwerk eronder helemaal worden gesloopt. Deze week begonnen om het helemaal uit te lijnen maar het oude raggelwerk is zo scheef dat het bijna onmogelijk is dit goed te krijgen. Dus slopen die handel en daarna opnieuw opbouwen



9 September 2017

In verband met een korte vakantie deze week maar 3 dagen wat kunnen klussen.

Maar wel aan een nieuwe grote klus begonnen het plafond in de slaapkamer. Helaas was het onbegonnen werk om het nieuwe raggelwerk wat onder het oude was gemaakt goed uit te lijnen. Dus na een paar dagen rust netjes het nieuwe raggelwerk eraf geschroefd en het oude raggelwerk met de koevoet gesloopt en daarna weer een dubbel raggelwerk mooi uitgelijnd opgebouwd. De eerste rij plafondplaten was behoorlijk k... omdat de verwarmingsbuizen in zaten en niet netjes naast elkaar liggen en de muur niet helemaal recht was. Uiteindelijk ligt de 1ste rij er mooi waterpas in. Hopelijk komt komende week deze plafond er helemaal in te liggen

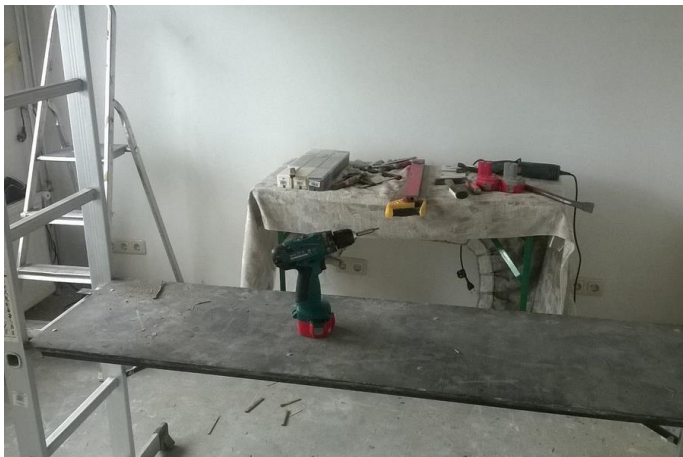



16 September 2017


het project plafons slaapkamers loopt niet geheel op rolletjes. De slaapkamer voorzijde is al 2x een gedeelte plafondplaten geschroefd en ook weer verwijderd omdat er verschil zat in de soort platen. Daarom een hele nieuwe partij gehaald maar geen witte maar een andere mooie kleur



De buis van de kabels mooi afgewerkt met een deksel met schuifbaar gedeelte voor het bijvoegen van nieuwe kabels



De lamp in de keuken is nu ook geheel afgemonteerd. Het probleem van het uitvallen van de electra groep is inmiddels ook opgelost door het plaatsen van een nieuwe automaat

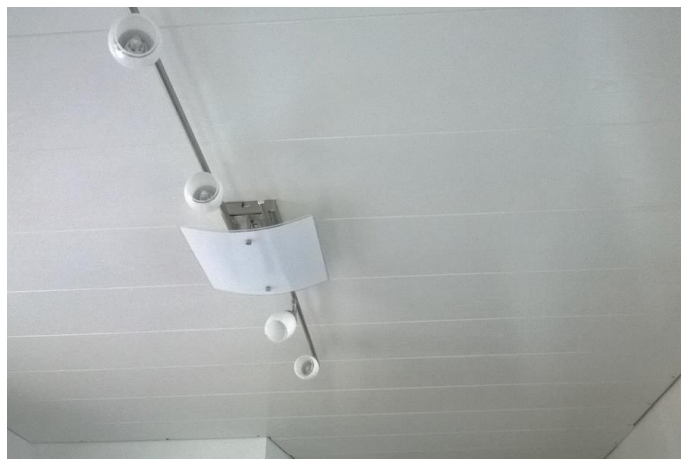

Deze week is de verwarming voor in de frietenkeuken geleverd. Nu kan er worden bekeken waar deze moet komen en dan aansluiten



Deze week zijn ze ook de schuttingen komen opmeten en deze worden half november geplaatst



De garage al gedeeltelijk opgeruimd en de garagepoort de isolatie verwijderd omdat er komende woensdag een nieuwe garagepoort wordt geïnstalleerd



23 September 2017

Zondag nog een extra ritje naar mol gemaakt voor nog een partij plafondplaten op te halen




Deze week is de nieuwe garagepoort geïnstalleerd door garagepoort limburg.



De wand in de toekomstige computerkamer aan de voor en achterzijde bekleed met hdm wandpanelen



Voor de 3de keer nieuwe plafondplaten in de slaapkamer geplaatst maar nu zijn ze helemaal goed .
Lekker kunnen doorwerken zodat deze helemaal erin zitten op de slaapkamer.

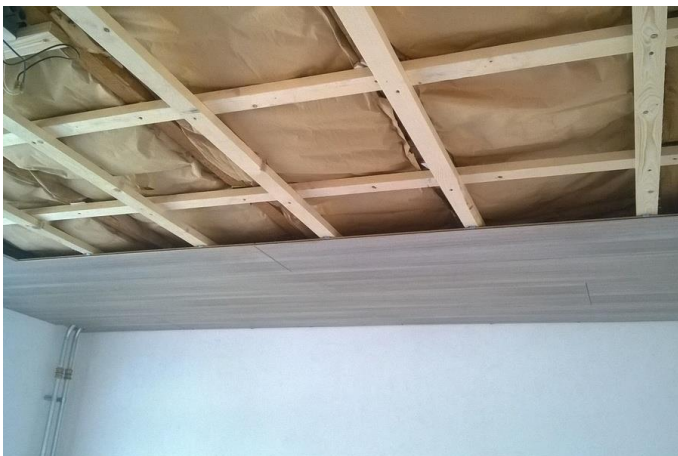





Ook in de kleine kamer aan de achterzijde is er een begin gemaakt aan de plafond. De eerste meter zit er tegen nog 2 meter te gaan. De extra plank voor de toekomstige gordijnenrooi moet nog worden vast gemaakt. Als de planning goed is zal deze week ook deze kamer de plafond er geheel inkomen en dan kan er weer een vinkje op de lijst worden gezet.



30 September 2017

De plafond in de kleine kamer aan de achterzijde helemaal afgemaakt

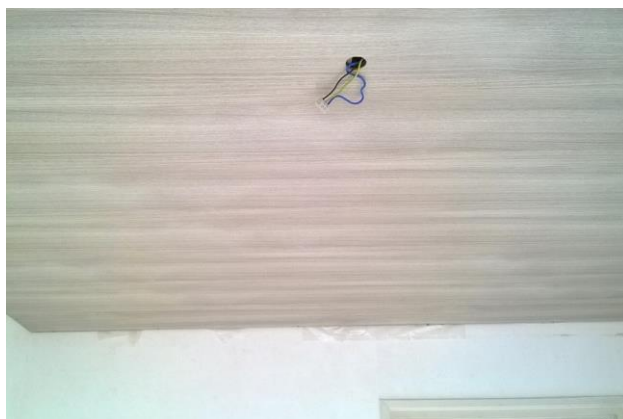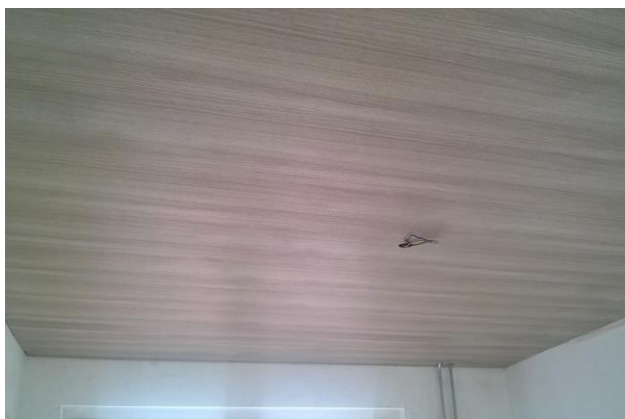

De vloer een gedeelte geegaliseerd en de plastic voor onder de ondervloer te leggen op maat gemaakt voor het leggen van de laminaat



De voorbereidingen voor het plaatsen van de schuttingen in November is ook deze week van start gedaan. Zo zijn de stenen langs de garage bij de buurman weggehaald en bijna alle betonpalen uit de grond getrokken. En een gedeelte van de struiken bij de buurman verwijderd





Omdat het buiten regent vandaag alle plafondplaten uitgezocht en een begin gemaakt aan de voorlaatste plafond op de 1ste verdieping.

