

# Januari 2018

## 6 Januari 2018

Deze week stilletjes aan weer begonnen met klussen. De meeste tijd op zolder bezig geweest met het isoleren



Ook even gaan shoppen in de verzaak Dols Storms en behang voor de bovenverdieping uitgezocht en gekocht



Voor de storm even tijdelijk het gat van de afzuiging in de bijkeuken dichtgemaakt met een rvs kapje



De afwerking met de aluminium stripjes aan de zijkant van de tegels is nu ook helemaal klaar en kan van het lijstje worden afgevinkt



Het was vandaag de bedoeling met de aanhanger nieuwe materialen te gaan halen maar omdat ik snap dat parkeren moeilijk is in de straat en heb er ook geen moeite mee als er wagens of bussen voor het huis staan maar als je niet normaal je eigen oprit op kunt zonder de oprit van de burens te gebruiken en niet weg kunt met je aanhanger gaat het toch wel de verkeerde kant op. En bellen om de wagen een stukje naar voren te zetten heeft ook niet veel geholpen omdat er niet wordt opgenomen. Planning nu moeten aanpassen en volgende week maar met de aanhanger mijn materialen halen





# 13 Januari 2018

Deze week ook op de zolder gewerkt verder gegaan met het isoleren. 4 vakken zijn ook inmiddels al helemaal afgewerkt met hdm platen. Daarna alles van de linker naar de rechterkant van de zolder gezet om daar verder te kunnen werken. De eerste isolatielaag zit er nu helemaal tegen. Nog ruim 5 vakken waar het houtwerk moet worden gemaakt voor de 2de en 3de laag isolatie en dan nog verder afwerken.



Ook deze week even in een woonkamer nieuwe gordijnen opgehangen.




## 20 Januari 2018

Deze week weer verder gegaan met isoleren op de zolder. de 2de en 3de laag zit er nu op 2 kleine stukken na erin en een groot gedeelte is dichtgemaakt met plastic





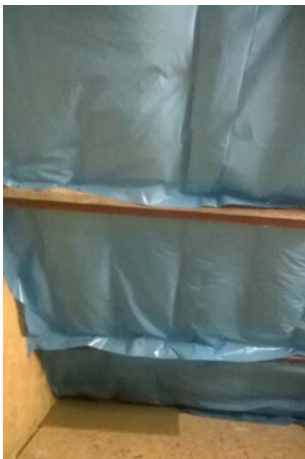



Komende week zullen de electra leidingen en draden worden getrokken op zolder voor de diverse lichtpunten en dan kan er een begin worden gemaakt met het aftimmeren van de schuine plafond

Inmiddels zijn de eerste vissen schelpen en inktvis al in het aquarium op zolder gespot




## 27 Januari 2018

Deze week weer op het allerhoogste nivo van het huis gewerkt. Zo zijn alle 9 de lichtpunten gemaakt en verdeeld over 6 schakelaars. Inmiddels zijn 6 lichtpunten al voorzien van spotjes en op het 7de lichtpunt staat de radio aangesloten.








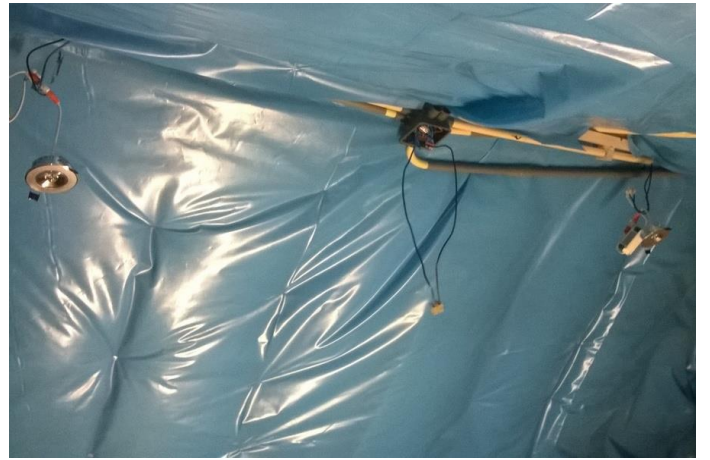



Onder de dakkapel is er ook hard gewerkt aan de afwerking met hdm platen

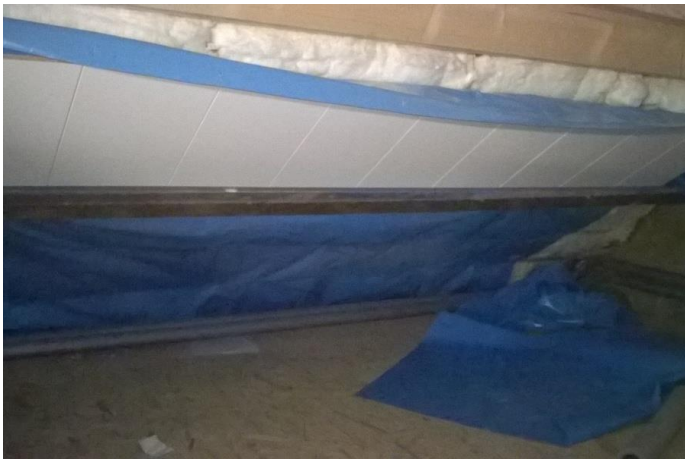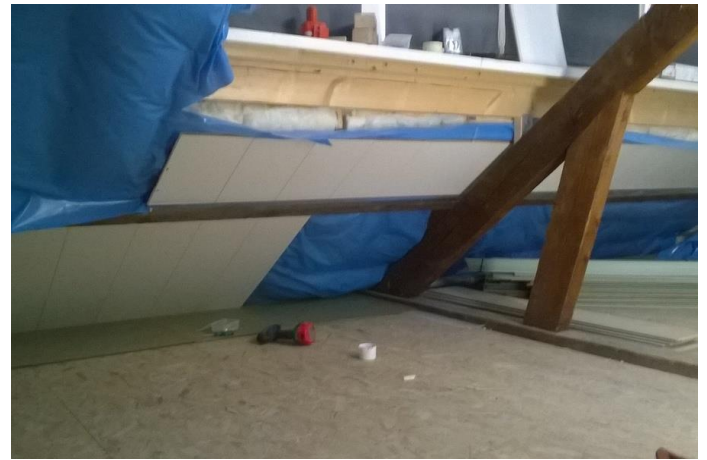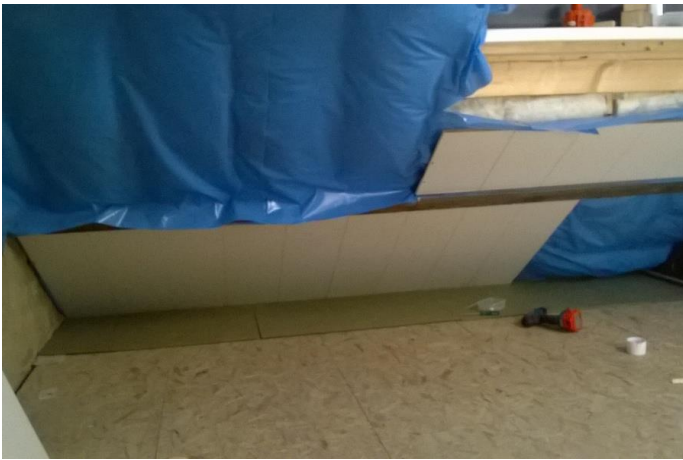

Ook de zijkanten van de dakkapel is inmiddels al voor een groot gedeelte voorzien van hdm platen



Tussendoor even een klein begin gemaakt met de carnavalsversiering voor het raam

