


# Juli 2018

## 7 Juli 2018

Ondanks het warme weer een grote klus geklaard en ruim 90 meter aan afwerklattjes gezaagd en vastgezet. Komende week alles verder afwerken met filler en dan kunnen de latten en balkjes in de gewenste kleur worden geverfd.

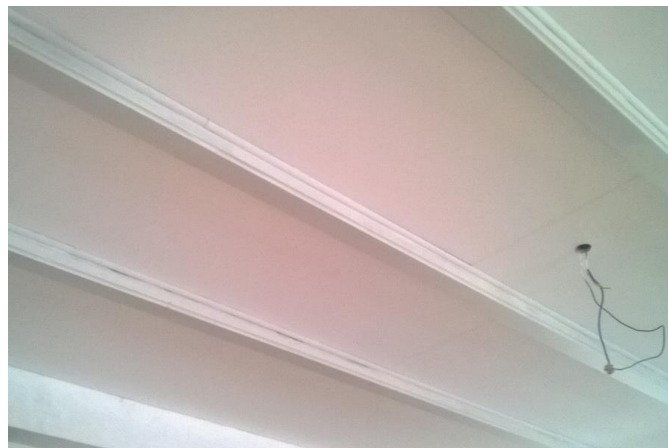

De kogel is door het huis en afgelopen woensdag tot een overeenkomst gekomen en de eerste week van september zal Tuin en Klussenbedrijf Leon beginnen aan fase 1 voor het opknappen van de oprit en riolering. fase 2 (het aanleggen van de bloembakken en terras) en fase 3 (het verwijderen van het groen langs de stoep en maken van de afrastering en bloembak aan de voorzijde) zullen later in het jaar worden besproken en uitgevoerd.

De aanhanger naar de dependance gebracht en nu kunnen de pallets stenen die nog in de voortuin staan in de garage worden gezet. Nog 1 pallet en dan is ook deze klus weer klaar




In verband met plaatsgebrek in de woonkamer de toiletdeur tijdelijk weer teruggeplaatst.




## 14 Juli 2018

Deze week een kort berichtje niet omdat het weer zo goed was maar door een ontsteking die moest worden aangepakt en daardoor even alle werkzaamheden voor onbepaalde tijd in de wacht worden gezet.


Hierdoor kan wel de administratie worden bijgewerkt en shoppen via internet. Zo zijn de deurstoppers opgehaald en inmiddels op zijn plek gelegd achter de deuren

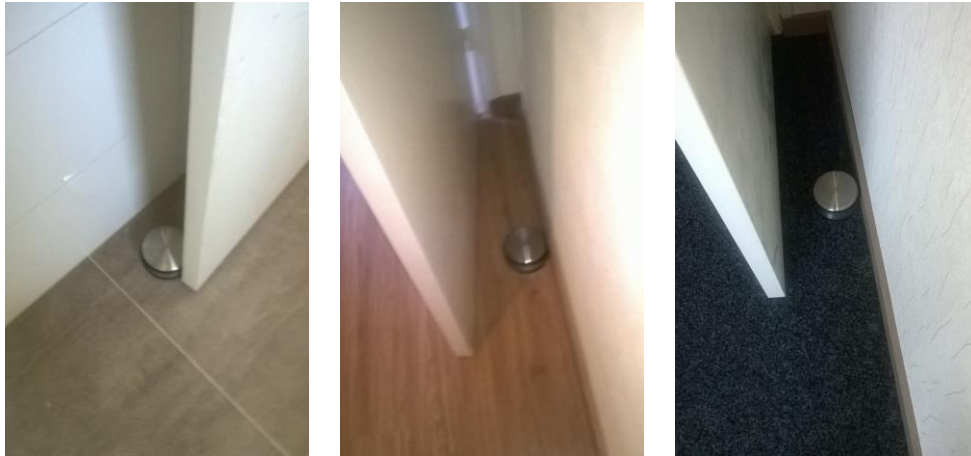

Bij het op zijn plek leggen van de deurstoppers tot schrik op diverse plaatsen de sierstrippen losgelaten en op de grond liggen en andere zitten nog gedeeltelijk vast. Dus daar moet een oplossing voor worden gevonden

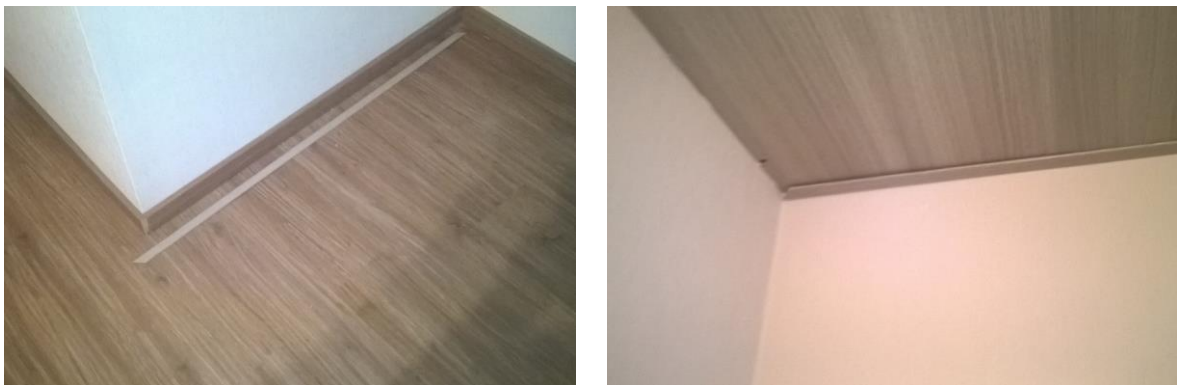

In de woonkamer is begin van de week nog even enkele balken afgewerkt met filler. De filler is door de winkel uit de handel gehaald dus voor de rest van de balken moet worden gekeken naar nieuw soort filler

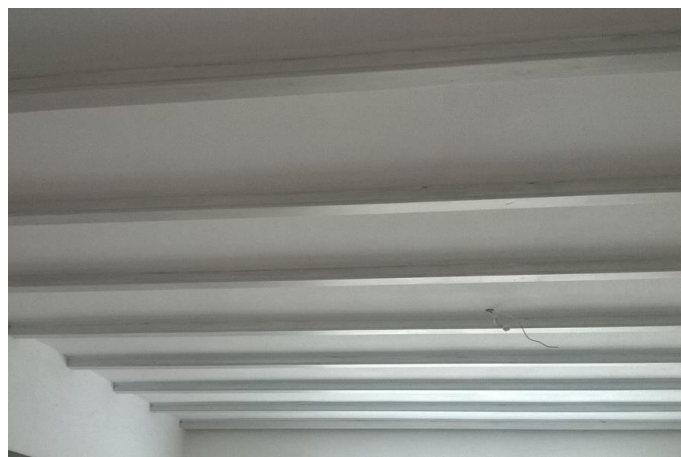

Enkele tuingereedschappen gekocht voor het komend jaar omdat er nu opheffingsverkoop was



## 21 Juli 2018

Deze week door het warme weer en nog wat nasleep van medische klachten niet veel geklust in het huis.


Het hang en sluitwerk in de keukendeur op de nieuwe plek uitgebeiteld en vastgezet en de plekken waar de oude scharnier heeft gezeten gedeeltelijk bijgewerkt



De pallets die in de garage stonden in de tuin gelegd om zo wat ruimte te maken voor de oude terrasklinkers. die de komende maand worden opgeraapt en schoongemaakt



Ook een begin gemaakt aan de trap bij de voordeur om de contouren zichtbaar te maken hoe het moet worden en dan kunnen de stenen worden besteld om de trap helemaal te vernieuwen met chinees gezoet blauwsteen.

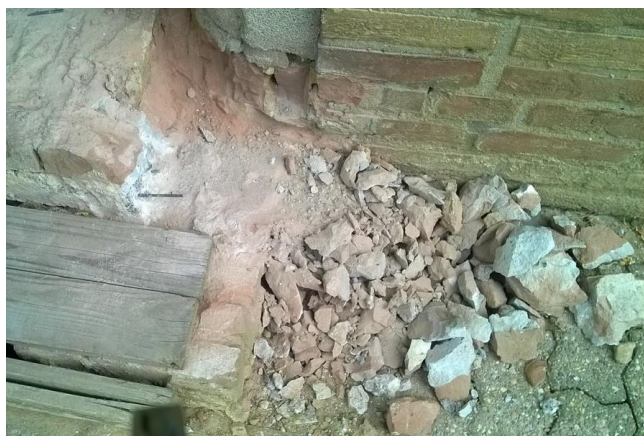

Ook aan de plafond in de kamer zijn kleine vorderingen. Zo zijn de kiertjes tussen de plafond en het afwerklatje helemaal klaar en voor ruim de helft ook de kieren tussen het afwerklatje en de balkjes. Hopelijk dat komende week alle kiertjes weg gewerkt zijn en nog een laatste hechtlaag op de balkjes kan worden gezet zodat de afwerklaag erop kan.

Inmiddels is het contract van woningopknappertje.nl opgezet per maart 2019 Dat is de eerste en enige datum die vast staat. De datum van verhuizing blijft in verband met het tropische weer opschuiven richting kerst

## 28 Juli 2018

Ook deze week het tempo aangepast.

Op 3 verschillende plaatsen begonnen van het oprapen van de stenen voor de oprit en op pallets in de garage gelegd. De rest komt in de voortuin op pallets

Tevens wat stenen gelegd om toch te kunnen relaxen in het 2zits bankje om niet in de zand te zitten





Het eerst kunststuk hangt aan de schutting



Als afsluiter van deze week een van de gaten op maat gemaakt zodat het spotje er goed in past

