


Juni 2018

2 Juni 2018



Het eerste afwerklatje op de plafond in de woonkamer is geplakt. Nog 38 stuks te gaan



De computerkamer is nu ook van het lijstje afgevinkt dat deze is behangen op naar kamer 3



Ook de 3de kamer is al behoorlijk opgeschoten met behangen ondanks het warme weer bijna 3 wanden zijn helemaal klaar

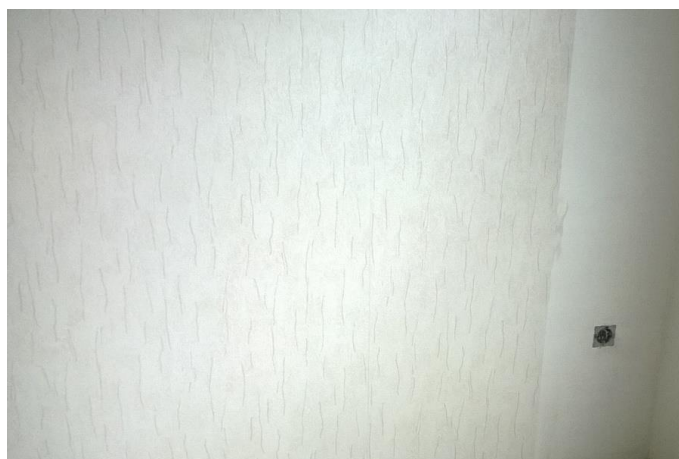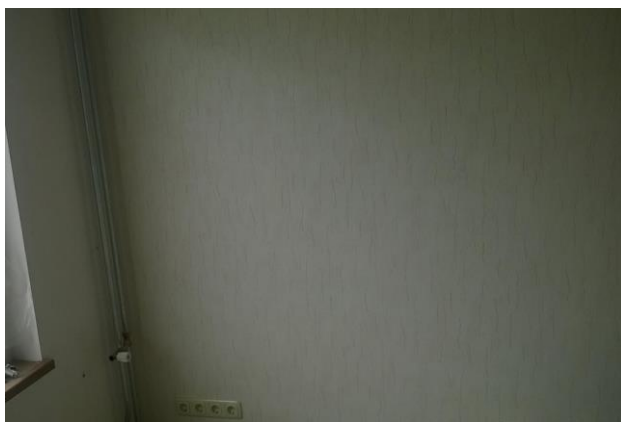

De Asdl kabel vanuit de meterkast via de zolder naar de computerkamer getrokken> Helaas was er halverwege tussen de plafond en de zoldervloer een buis gebroken zodat de kabel niet verder kon worden getrokken. Na een gedeelte laminaat en vloer uitgezaagd te hebben kon de buis worden gerepareerd en de kabel verder getrokken tot de eindbestemming.



Op de computerkamer de wand waar de zoldertrap achter zit het laatste hdm plaatje vastgeplakt zodat ook hier alleen de afwerkstripjes nog moeten worden geplaatst



De voorbereidingen voor het opnieuw leggen van de oprit zijn ook in volle gang de eerste offertes zijn binnen en een aanhanger met pallets gehaald om alle stenen er op te leggen



Een gedeelte vakantiegeld opgehaald aan de afwerklijstjes van de plafonds en plinten voor alle 3 de kamers op de 2 de verdieping



Het eerste begin van de plinten is gemaakt. De logeerkamer zijn bijna alle plinten al op maat gemaakt en een gedeelte al vastgeplakt. Komende week zal de rest worden vastgeplakt




De cementvloer bij de deurmat is nu ook helemaal droog en de mat ligt netjes op zijn plek.



9 Juni 2018

Een begin gemaakt de groene verf van de kozijnen af te halen op de begane grond.

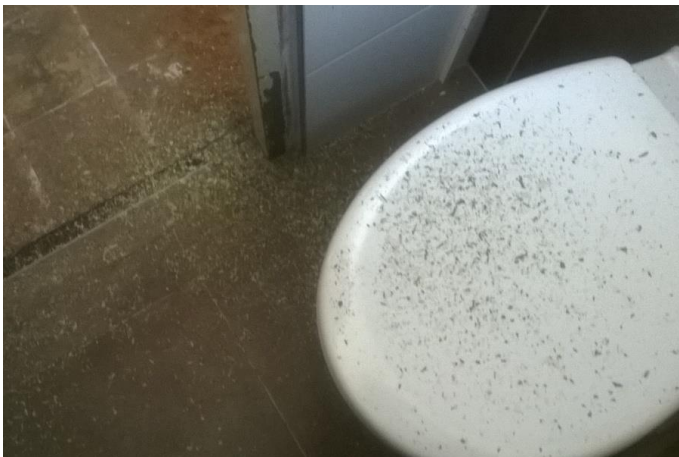

De slaapkamer aan de voorzijde is nu ook behangen en de verwarming hangt alweer op zijn plek






De heg maar snel geknipt voor de hoveniers langs komen voor het opmaken van een offerte voor het aanpakken van de voortuin en de oprit



Op de computerkamer begonnen met het zetten van de plinten en in de logeerkamer zitten ze op een paar kleine stukjes na allemaal vast

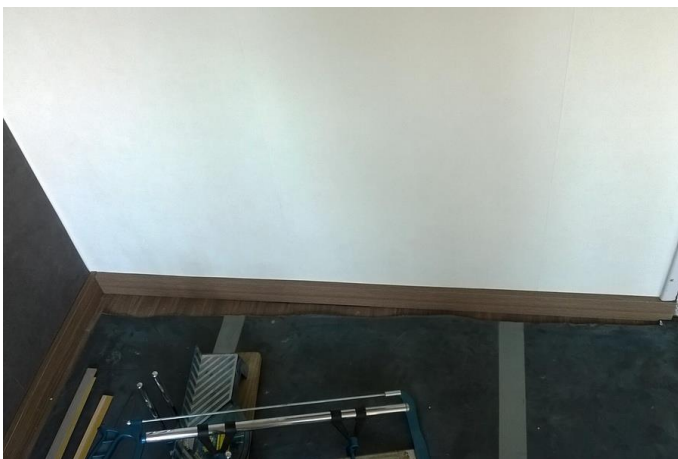


De trap naar de zolder is geschuurd en zitten 2 lagen trappenverf op de komende week nog een laagje en weer een klusje van het lijstje




De toilet op de begane grond is nu ook geheel behangen en de spiegel moet nog worden teruggehangen



Nu de plafond bij de logeerkamer aanpakken met het plakken van de afwerkstripjes het gaat wat moeilijker als verwacht maar met wat stutten gaat ook dat wel lukken

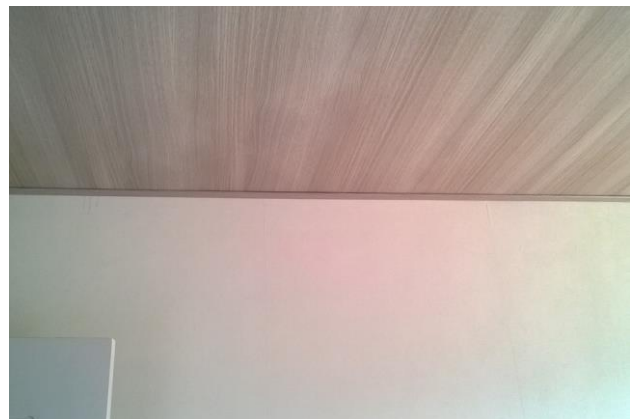

In de woonkamer al een mooi stukje kunst op de muur gemaakt

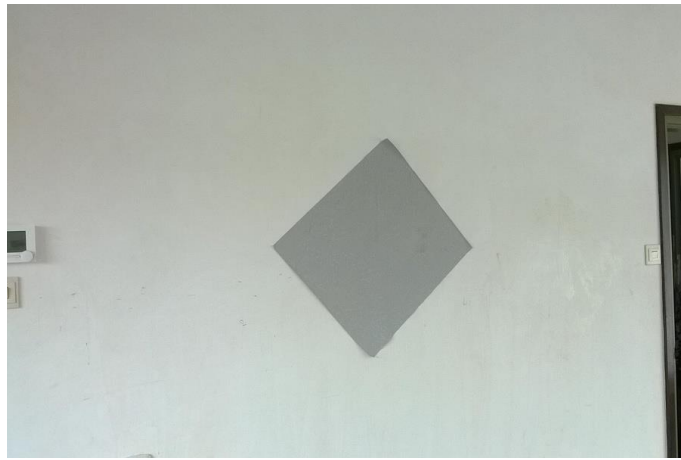

16 Juni 2018

Deze week wat kleine en middelgrote klusjes afgemaakt.


Zo is de spiegel op het toilet weer opgehangen



De trap naar de zolder is nogmaals geschilderd en ook de leuning heeft inmiddels een mooi lak laagje gekregen



Het passtuk van de wand naar de zolder gezaagd en vastgezet zodat deze zijde nu ook klaar is

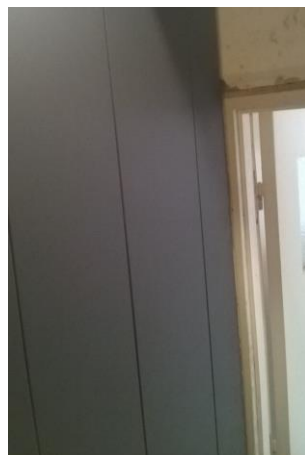




De vloerbedekking geheel van de trap afgehaald en een groot gedeelte van de trap schoongemaakt. volgende week vrijdag wordt de slaapkamer, hal boven, de trap en de hal onder vloerbedekking gelegd



De deuropening van de hdm wand die in computerruimte de zoldertrap verbergt gedeeltelijk afgewerkt met een profiel voor tyong blokken mee te lijmen



De afwerking van het plafond bij de slaapkamers is al redelijk gevorderd en komende week zal ook dit klusje van de klusjeslijst worden afgestreept

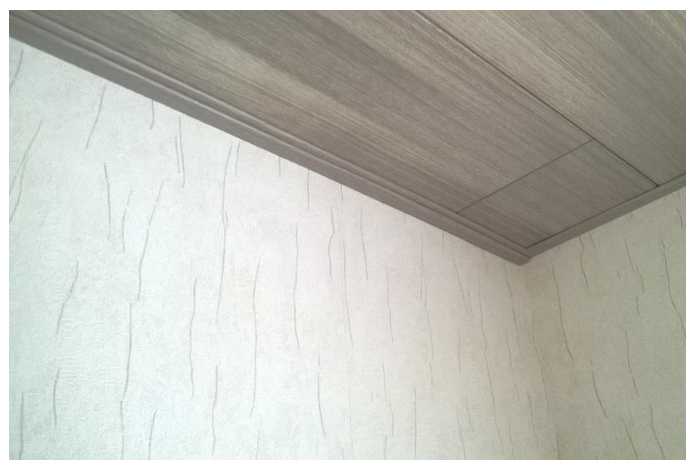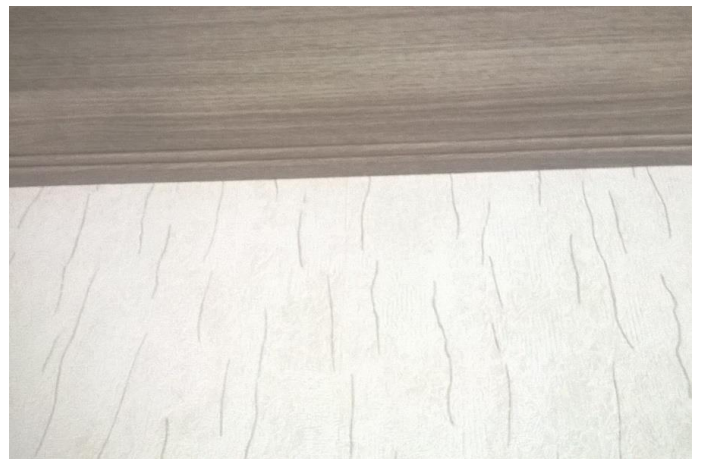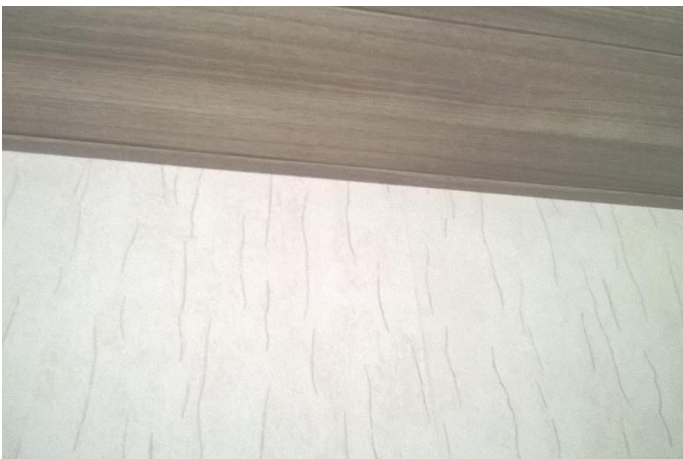

Deze week is 4800 kg beton blokken (160 stuks) geleverd via Steenrijk Sittard voor de bloembakken in de achtertuin



Een pallet is nu achter in de tuin gebracht maar helaas hadden het er 2 moeten zijn Door wat kleine lichamelijke probleempjes ligt dit een beetje achter op schema



Even een paar stenen op proef los op zijn plek gelegd om te kijken hoe het eruit ziet.

Moet alleen nog iemand vinden die een paar stenen kan door flexen zodat ik de stenen op de goede plek kan leggen en ook vastlijmen



23 Juni 2018

Deze week zijn er weer enkele grote en kleine klussen uitgevoerd.

Zo is Thieu Cosemans de glas en looddeur van de hal naar de keuken komen afhangen

De tweede pallet met stenen staat inmiddels ook al achter de poort de helft moet nog naar achter maar de vooruitzichten voor volgende week zijn te goed om dit zware werk te gaan doen

Bij de logeerkamer is het stuckarton weggehaald en daarna de vloer schoon gemaakt en gedweild zodat het bed kon worden opgezet.



De trap naar de zolder is nuna 7 dagen uitgehard en op de tredes de stukken vloerbedekking vastgeplakt.



Alle vloerbedekking uit de woonkamer gehaald en in stukken gesneden en tijdelijk op de aanhanger gelegd. Inmiddels heeft de vloerbedekking zijn laatste bestemming bereikt het gemeente lager van Stein



De schakelaar voor het rolluik aan de voorzijde is inmiddels door de Post geleverd en zit inmiddels op zijn plek nu alleen het rolluik nog bestellen en laten ophangen





Vrijdagmorgen om half 9 zijn de mannen van Harobo Born begonnen aan het leggen van de vloerbedekking in de slaapkamer voor, de hal boven trap en hal onder. Binnen twee en een half uur was alles klaar.





Nadat de vloerbedekking is gelegd gelijk begonnen met het plaatsen van de plinten. op enkele kleine stukjes na is ook deze kamer helemaal klaar met de plinten

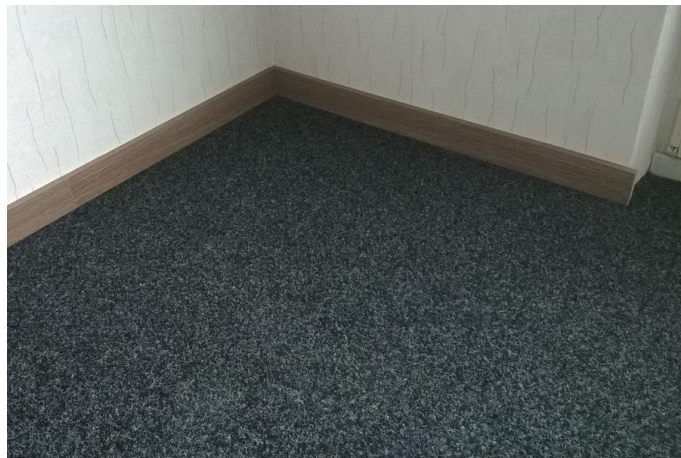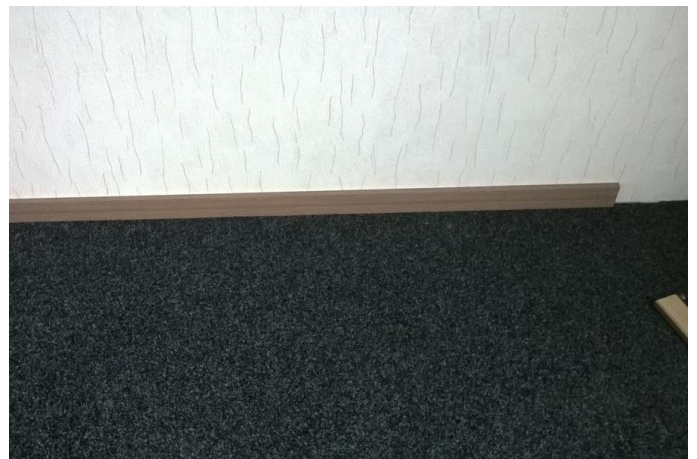

Een gedeelte van het bed van zolder gehaald en eerst goed afgesopt en daarna een gedeelte in elkaar gezet. Zodat ook deze kamer eruit ziet alsof het klaar is maar schijn bedriegt ?



Omdat de vloerbedekking nu kwetsbaar is voor zand en andere rommel is er tijdelijk op de trap en in de hal gordijnen gelegd ter bescherming en moet eerst de vloer op zolder worden afgelegd met laminaat zodat er dan van boven af naar onder alle vloeren schoon kunnen worden gemaakt en geen rommel meer van boven naar onder kan worden gelopen in de vloerbedekking. Door tijd gebrek en te veel rondleidingen door het huis te hebben geven is deze klus nog niet helemaal af (of te wel te weinig ondervloer om de klus af te maken en de winkels zijn dicht)



Ook was de planning dat deze week de afwerklatjes in de woonkamer zouden worden geplaatst maar door andere prioriteiten te stellen is er wel een begin gemaakt maar zal deze klus even worden doorgeschoven



Zoals de weersverwachting komende week eruit ziet zal er dagelijks worden gekeken of het tropenrooster in werking wordt gezet. Om daar rekening mee te houden is de countdown teller bijgesteld en nog met 31 dagen verhoogd.

30 Juni 2018

De matrassen in de bedden gelegd en de laatste stukken plint gezet en daarna de slaapkamer gestofzuigd



De laminaat op zolder helemaal afgelegd met 2 kleuren. Daarna is de poetsploeg bezig geweest met vegen, swifferen en dweilen om alles stofvrij te maken



Ook even in het buitenland gaan shoppen voor een spiegel met een afrikaanse olifant erop. Nu alleen nog een plaatsje vinden van 140×50



Op een klein stukje afwerklatje na op de computerkamer zijn alle plafonds op de 1ste verdieping klaar. Maar het is wel het moeilijkste stukje omdat daar de muur bol is en een gedeelte van het latje moet worden weggeschuurd.



Ook komende week zal er volgens tropenrooster worden gewerkt en een aantal uren voor verkoeling worden gezorgd in het zwembad. Hierdoor zal de countdown teller moeten worden aangepast met nog minstens 7 dagen

