


Mei 2018

5 Mei 2018


Deze week is er verder gegaan met het verven van de plafondplaten tussen de balkjes en daarna alle balkjes ontdaan van de structuurverf en bruine smeerlaag.




Met behulp van de steiger verder gegaan met het plaatsen en uitzagen van de hdm platen in het trapgat naar de zolder

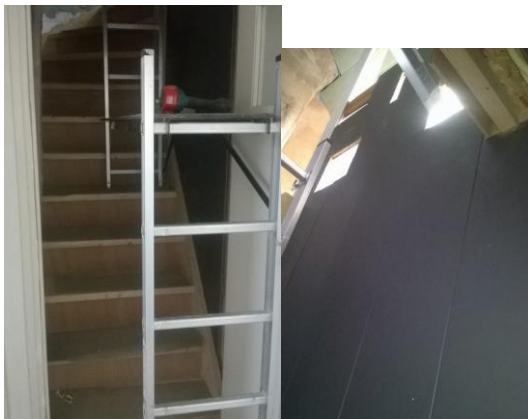

Deze week begonnen met het behangen van de logeerkamer. Met wat tegenslagen en tijdgebrek toch ruim 1 muur behangen.

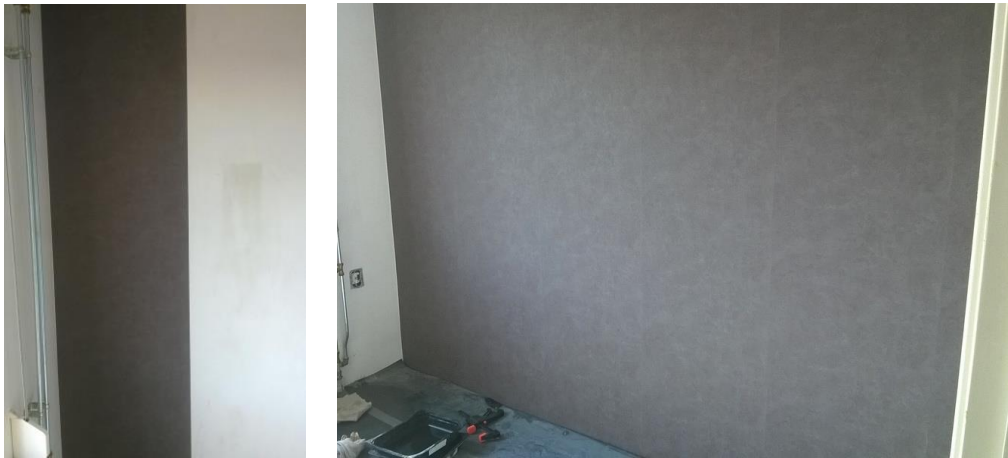

De verwarming losgekoppeld om goed te kunnen behangen en tevens folie erachter te plakken

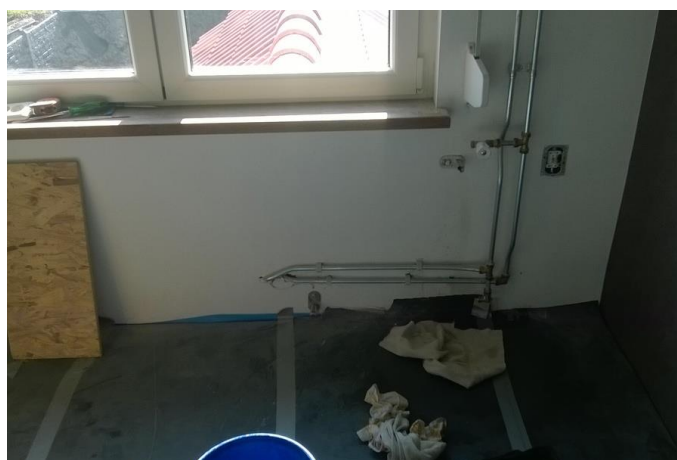


12 Mei 2018


De sleuven voor de watervoorziening in de toekomstige badkamer zijn gemaakt. Klusbedrijf Ron Houben komt binnenkort de leidingen persen zodat alles dan netjes kan worden vastgezet



De logeerkamer is op een klein stukje boven en onder het raam helemaal behangen

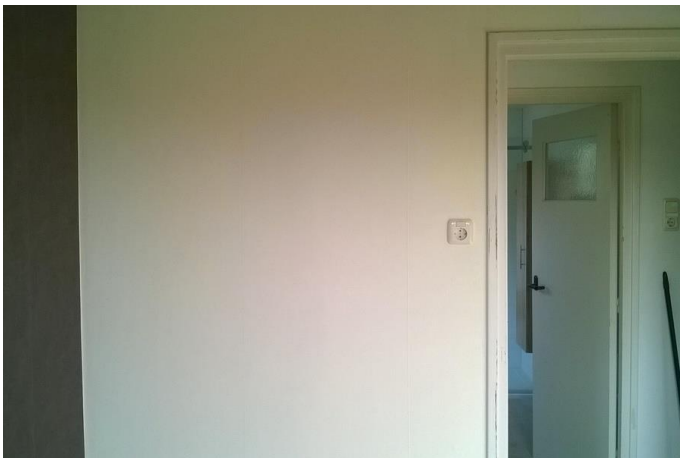

De 2de nokpan die stuk was vervangen. Eerst alle nokpannen van vooraf moeten losschroeven en daarna weer helemaal vast gezet. Op wat schaafwonden en blauwe plekken na is alles goed gegaan.

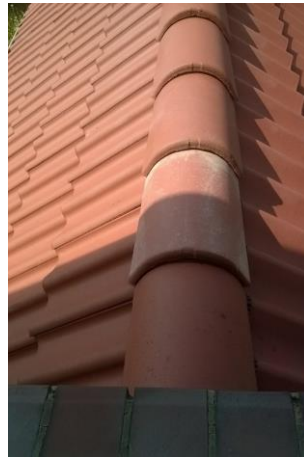

De computerruimte wordt inmiddels ook al voorbereid om te worden behangen zo zijn er verschillende muren al ingesmeerd met verdunde lijm en de verwarming losgekoppeld.



Buiten weer een paar stenen gemetseld maar door de warmte moeten stoppen omdat de cement te snel droogt.





De voorbereidingen aan het treffen voor de nieuwe aansluiting van de afvoer van het dak. Er zullen weer sloopwerkzaamheden volgen voor deze buis op zijn plek ligt



19 Mei 2018

De logeerkamer is geheel behangen. De computerkamer zit ook al alles vliesbehang ertegen en nu begonnen aan het gewone behang op de ander 3 muren. Zodra die klaar zijn kan er weer een klusje worden afgevinkt.

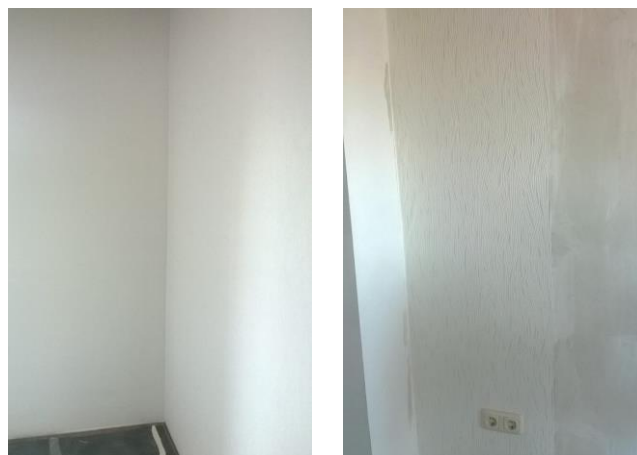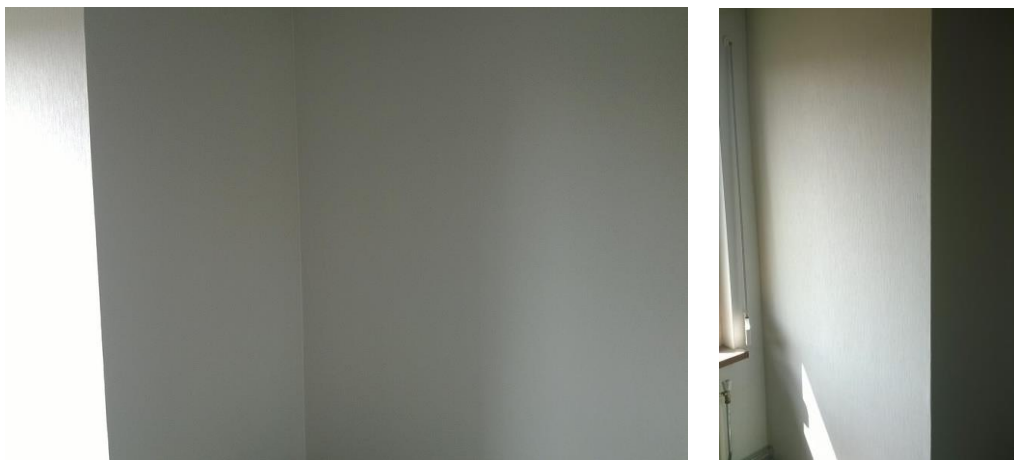

Om de lijm van het vliesbehang op te maken tussendoor ook een muur op het toilet op de begane grond behangen weer wat meer kleur in het kleinste hokje.




In de woonkamer zijn de balkjes afgewassen en daarna met hechtmiddel geverfd. Komende week naar de winkel voor de latex op kleur te laten maken en dan beginnen aan de afwerklatjes voor tegen de balkjes te verven.



Klussenbedrijf Ron Houben is de waterleiding komen leggen en afpersen voor de toekomstige badkamer. Daarna de leidingen vastgezet en gedeeltelijk dichtgestuct




Het ijzerwerk van de deurmat dat gemaakt is door Coors Technical Services ingemeten en uitgekapt uit de tegelvloer. Komende week vastzetten en een mooie afwerking binnenin maken. Zodat de mat die nu even voor de foto erin is gelegd dan erin kan blijven liggen.

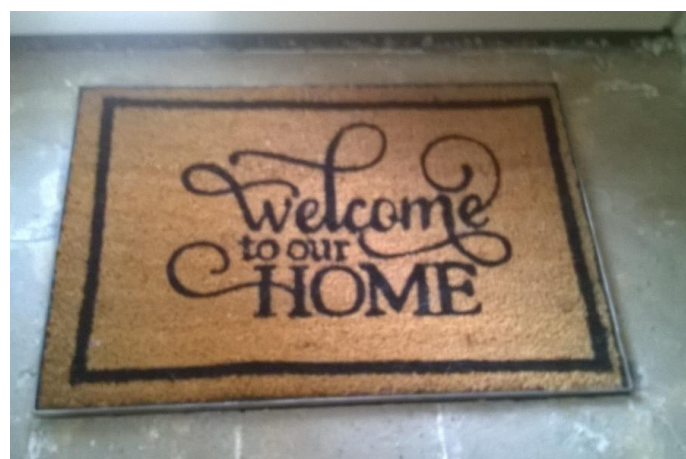


Deze week zijn de plantjes buiten gezet



De fundering van de bloembak op het bovenste terras gelegd en uitgemeten

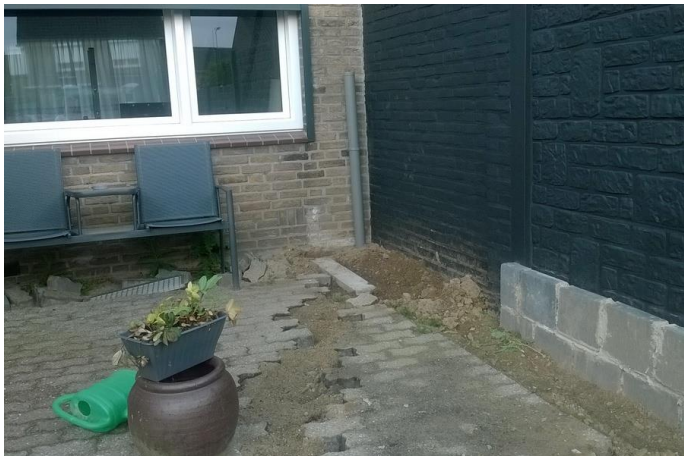

De nieuwe afwateringspijp gelegd en een gedeelte van de trap van het bovenste terras naar het mooie heuvelachtige paardebloemen weide gesloopt. Komende week als het weer meezit en de aanhanger leeg gaat de rest van de trap ook weg

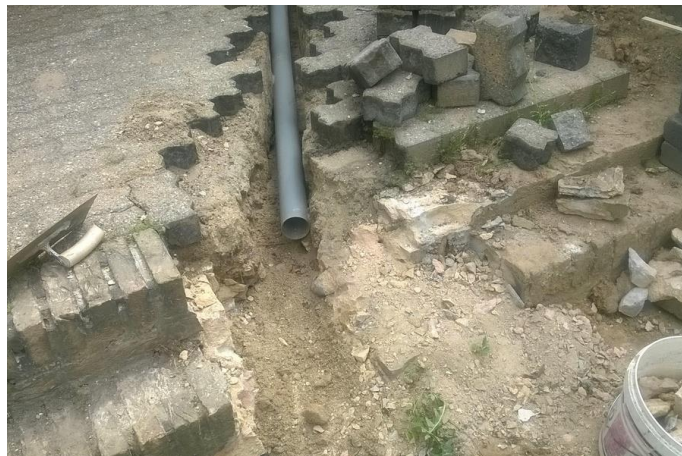




26 Mei 2018

Het raamwerk waterpas gelegd en een mooi nieuw vloertje beton erin gelegd nu nog een weekje drogen en de deurmat kan erin




De balkjes hebben een 2de hechtlaag in een lichte grijs tint gekregen en de 96 meter afwerklatjes zijn nu 2x de orginele licht grijze tint geverfd.

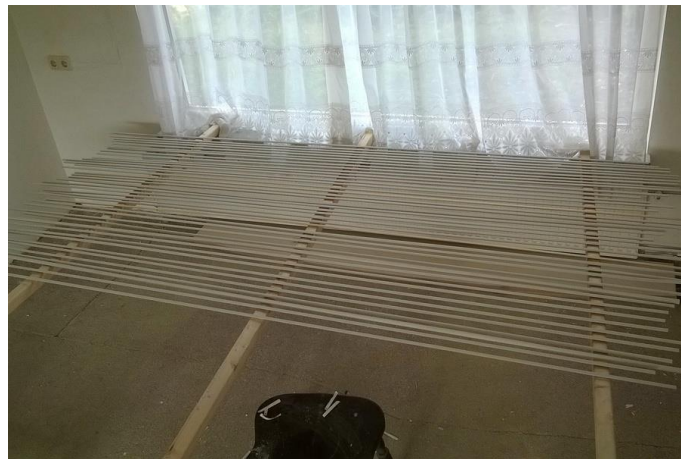


De achterkant van de verwarmingen in de logeerkamer en computerkamer zijn nu voorzien van een aluminium folie. Daarna weer netjes opgehangen en vastgezet zonder een lek te bespeuren.



Ook op de computerkamer worden de muren stilaan allemaal voorzien van een mooi behangetje en daarna worden gelijk de stopcontacten weer terug geplaatst

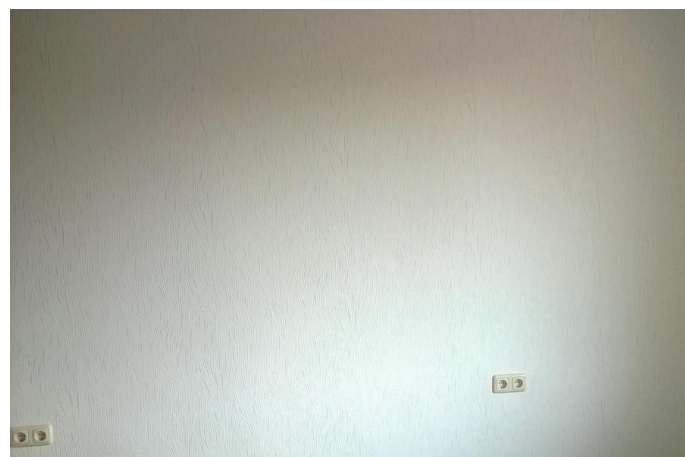

Nu de computerkamer ook bijna klaar is met behangen begonnen aan de voorbereidingen te treffen voor de slaapkamer aan de voorzijde en de wanden al 1x ingesmeerd met verdunde behangplaksel.

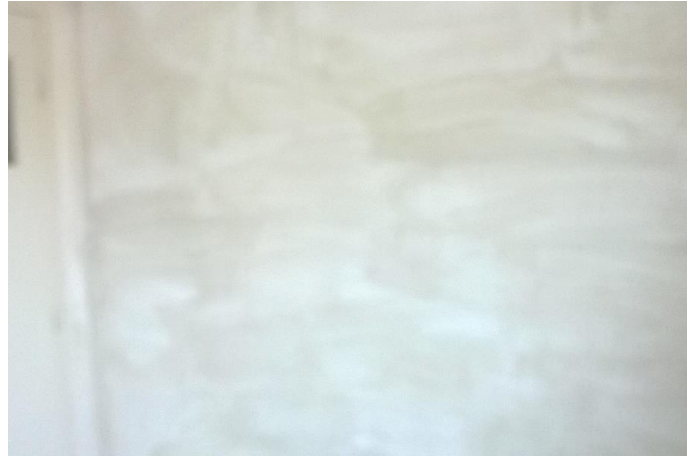

De komkommerplanten staan nu ook buiten in de pot.



In verband met het warme weer de komende week zijn de werk en bezoektijden aangepast tot een minimum van tropen rooster en zullen er verplichte zwembad uurtjes voor in de plaats komen.
