

September 2018

1 September 2018

De laatste voorbereidingen voordat Tuin – Klussenbedrijf Leon volgende week begint aan de oprit opnieuw te bestraten en de riolering geheel wordt vervangen. Nieuwe opsluitbandjes gehaald, de laatste rij stenen weggehaald en ook de laatste stenen gemetseld in het luik zodat het zand en stol er niet in kan vallen.



Voor wat meer ruimte om materialen te plaatsen nog een gedeelte struiken verwijderd



De hoofdriolering van achter de poort naar het eerst aftakpunt uitgegraven zodat deze ook volgende week kan worden aangesloten



Een klein stukje van de plafond moest nog worden afgemaakt nu maar een begin gemaakt zodat volgende week de andere kant kan worden vastgeplakt en afgewerkt




De eerste 3 balkjes en de balk boven de bar heeft de eerste verlaag erop zitten. komende week verder zodat er hopelijk in deze maand kan worden begonnen aan de muur te behangen in de woonkamer met stenen patroon.



8 September 2018

Deze week is Tuin- Klussenbedrijf Leon met zijn mensen druk bezig geweest met fase 1 het uitgraven van de oprit, verwijderen van de riolering en oude putten, nieuwe riolering leggen, nieuwe ondergrond en zandbed gemaakt, herbestraat van de oprit en als bonus gelijk fase 3 erachteraan en de patioblokken geplaatst en afgewerkt met natuurstenen platen. (fase 2 wordt in 2019 uitgevoerd)

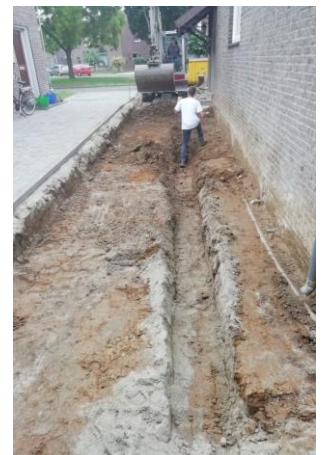





Tijdens deze dagen zijn er diverse filmpjes gemaakt en gemonteerd en staan ook op mijn youtube kanaal. Hieronder de filmpjes van dag tot dag veel kijk plezier






Aanstaande dinsdag wordt de zwarte split geleverd



Ook de riolering achter de poort is gedeeltelijk klaar en het paadje is weer dichtgemaakt.

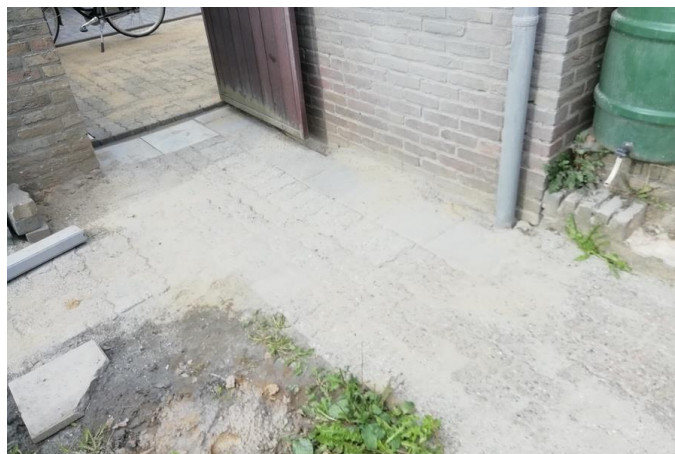

De zand die te veel was ligt nu achterom en zal worden gebruikt voor het realiseren van fase 2 in 2019



Inmiddels zijn de helft van de balkjes geveerd.



De balk tussen de keuken en woonkamer heeft nu ook de goede kleur en de spotjes zitten nu op zijn plek.



Deze week is er veel gebeurd door veel mensen. Mijn bijdrage heeft helaas aan het eind van de week een andere wending gekregen. Vrijdagmorgen bij de huisarts geweest en mocht ik een foto sessie gaan laten maken in het ziekenhuis. Ook deze foto sessie verliep niet helemaal vlekkeloos en nogmaals nieuwe foto's moeten maken. Zwaar gekneusde vinger nu 2 weken rust

15 September 2018

Eerst de voortuin vlak gemaakt en worteldoek gelegd.



Dinsdag is de split geleverd. Alles netjes verdeeld en tijdelijk 3 kleuren heiplantjes in een pot erop gezet.





Ook van het leveren van de split is een filmpje gemaakt dat op mijn youtube kanaal staat



In de dakgoten voor het tegenhouden van bladeren een bolroos gezet.



Het laatste gedeelte fundering gestort voor de lange bloembak langs de schutting



De muur in de woonkamer met het stenenpatroon is deze week een begin aan gemaakt en buiten verwachting helemaal klaar gekomen inclusief het voegen van de muur.



22 September 2018

De voorbereidingen getroffen voor verder te gaan met behangen in de woonkamer eerst de muren 2x ingesmeerd met plaksel om het sterk zuigen van de muur tegen te gaan. De verwarming in de woonkamer voor afgekoppeld.



Nadat alle voorbereidingen klaar waren is het behangteam verdergegaan en is de hele voorkamer klaar met behangen. De stopcontacten zitten weer overal op zijn plek en ook de verwarming hangt weer op zijn plek maar moet alleen nog worden gevuld. Komende week zal er een begin worden gemaakt aan de achterkamer.



In verband met het lekkere weer ook het buitenwerk nog verder aangepakt. Zo zijn de achterkant van de bloembakken bijna helemaal klaar.



29 September 2018

Deze week is er een 2de generale repetitie geweest hoe het was in de keuken te ?????? (resultaat is onderaan het bericht te zien)

Een test opstelling klaargezet waar de dressoir met tv moet komen te staan



Een gedeelte paadje naar de garage en een stuk klinkers gelegd voor de afvalbakken



Ook is er weer verder gegaan met het behangen van de achterkamer. Zo moest de radiator eraf en ging dit helaas niet zonder een waterballet op de vloer. Na het behangen is er isolatiefolie achter geplakt en de radiator weer terug gehangen. Op een klein stuk na voor de bar en boven het raam in de achterkamer na is de gehele woonkamer klaar met behangen. Op richting keuken maar daar moeten eerst nog voorbereidingen worden getroffen zoals stopkontakten verwijderen afzuigkap weghalen en de muren insmeren met behangplaksel



De stenen klaargelegd voor naar de kruipruimte te brengen om deze op te stapelen en de ijzeren balk te plaatsen om de woonkamervloer te ondersteunen.



In de meterkast nieuwe isolatiemat op de plafond gelegd en daarna de plafond weer dichtgemaakt



De buizen voor de radiator in de badkamer op de begane grond verlengt en aangesloten nu nog waterdicht maken



Vorbereidingen in de keuken zijn al gevorderd de eerste laag plaksel zit erop



In de badkamer op de begane grond de gipsplaten als vloer gebruikt zodat er tussen de balken in kan worden geïsoleerd en in 2019 een nieuwe plafond kan worden gemaakt



Zoals beloofd eerder in het bericht het resultaat van de 2de generale repetitie in de keuken

