

December 2016

3 December 2016

Weer een week voorbij waar ik weer werkzaamheden uit handen heb moeten geven omdat het met de gezondheid nog niet wil lukken ondanks dat er wel wat verbetering in zit

Na maanden mailwisseling met keukenkampioen over een ovenrek de volgens van whirlpool niet bestaat via een andere website besteld. Op deze website wordt 5x vermeld dat het een originele whirlpool ovenrek en na een dag wachten is de rek binnen en past. Het bakken van de worstenbroodjes is weer een stapje korter bij



Ook heb ik Roy Sniijders stucadoorsbedrijf ingeschakeld om de muren te gaan stucen . Komende week zal er contact zijn wanneer de werkzaamheden zullen worden gestrat. Er moeten nog wat dingen gebeuren voor er wordt begonnen en na een slapeloze nacht zal ik Roy Sniijders volgende week even bellen om te vragen de werkzaamheden kunnen worden uitgesteld naar begin 2017 omdat ik helaas zelf niet alles kan doen en afhankelijk ben van andere. Maar dat zal best wel goed komen

Om gelijk de daad bij het woord te voegen zijn er al enkele mensen bezig geweest met overal de gordijnen af te rapen en om toch een beetje privacy te hebben de ramen afgeplakt met mooie doorzichtige plastic



Ook is er een begin gemaakt met het slopen van de kamervloer waar ongenode gasten (houtworm) inzit. Volgende week zal deze klus worden geklaard en hopelijk wordt dan ook de vloer dicht gelegd als de vloerplaten op tijd binnen zijn



Door alle werkmensen over de vloer te hebben wordt er overal rommel gemaakt en zal er door het hele huis de bezem moeten. Dit weekend eens op zoek gaan naar een schoonmaakploeg



10 December 2016

Deze week is weer veel gebeurd door derden. Het gaat met mijn gezondheid de goede kant op en stilaan wat kleine klusjes als het verzorgen van de koffie en wat opruimen ect.

De laatste groep in de meterkast is deze week aangesloten en zal in het voorjaar vanuit de kelder doorgetrokken worden naar de garage en de buitenverlichting. ook zijn in de kruipruimte stopcontacten geplaatst. Ook ve verlichting voor naar de zolder te gaan is opgehangen en wordt binnenkort aangesloten



De vloer in de kamer is er helemaal uitgehaald en onder de vloerbedekking kwam de oude stenen vloer uit waar vroeger de kachel heeft gestaan. Inmiddels is de vloer helemaal dicht maar moet alleen nog worden vast geschroefd. De accu's zijn reeds opgeladen





De nieuwe vensterbanken in de woonkamer zijn ook uitgezocht en deze worden geplaatst voordat de stucadoor Roy Snijders de woonkamer komt stucen in 2017




Ook de muren in de toiletruimte op de begane grond hebben inmiddels een laagje stuc gekregen van klusbedrijf Ron Houben.



De verwarmingsketel is deze week geplaatst en ondanks dat sinterklaas met zijn pieten het land uit waren zat er afgelopen vrijdag toch nog een piet op het dak die de dakdoorvoer van de ketel heeft gemaakt. Ook is op de 1ste verdieping al wat leidingwerk klaar en de verwarming opgehangen



Zoals al eerder geschreven is sinterklaas uit het land en kunnen de kerstspullen van zolder. Dit jaar niet te uitbundig maken omdat de buurt er misschien aan moet wennen dus dit jaar het balkon wat lampjes ophangen

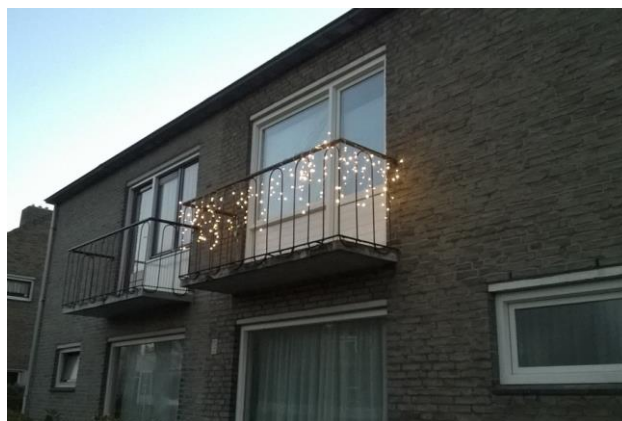

17 December 2016

Gisteren 16 December om kwart over 11 is het precies een jaar geleden dat ik bij de notaris heb getekend voor het huis. Daarom is de header van de website ook vandaag aangepast en zijn er op Google+ weer foto's geplaatst

In de tussentijd is veel gebeurd inmiddels zijn er 16 aanhangers groen en 20 aanhangers puin afgevoerd

Een mooie vaste trap naar de zolder is geplaatst. De asbest is helemaal verwijderd en een dakkapel geplaatst

De badkamer op de 1ste verdieping is bijna klaar en ook de toilet op de begane grond is al in de fase van afmonteren.

De keuken staat maar moet nog een plafond in en het stucwerk moet nog even een correctie ondergaan zodat daarna de tegels tegen de achterzijde van het aanrecht aan kunnen

Nu even genoeg over het afgelopen jaar en even kijken na deze week.

Woensdag is er 195 m2 isolatiemateriaal geleverd voor plafond en schuindak te gaan isoleren



het laatste gedeelte stuk hout is geplaatst om de rest dicht te maken met pur zodat de onderste trekgeaten dicht zijn



Donderdag is een gedeelte van het verwarmingssysteem in bedrijf gegaan en nu is er ook warm water in het huis. Alles al weer voorbereid zodat maandagavond verder kan worden gegaan met de andere kant van de verwarmingssysteem



In de gang is een gat gefreesd voor een usb aansluiting voor het opladen van de telefoon



Ook is vandaag de poetsploeg geweest en de zolder en 1ste verdieping grondig opgeruimd en schoongemaakt

24 December 2016

Deze week is even wat minder goed begonnen na 4 dagen was de verwarmingsketel stuk. Vrijdagmiddag is de monteur van Remeha langs geweest en de hele automaat / printplaat eruit gesloopt en vervangen. Hopelijk is het probleem nu opgelost vanmorgen was het lekker 17 graden in huis lekker temperatuurtje om in te werken

Om deze week niet steeds in de kou te werken en de keukenapparatuur stilaan moet worden uitgetest zijn er woensdag tussen de opruimklusjes door worstebroodjes afgebakken en natuurlijk ook geprobeerd



Er is een begin gemaakt aan het afmonteren van de toilet op de begane grond. Het ziet er al af uit maar de aansluitingen moeten nog worden gedaan en dat zal dit jaar nog worden afgemaakt




Om zoveel mogelijk de warmte binnen te houden begonnen aan het op maat maken van de deur voor in de meterkast. De deur een stukje smaller gemaakt



De isolatierollen op zolder gezet zodat alles klaar staat voor de kaboutertjes die zich misschien tijdens de feestdagen vervelen. Zo niet zal dit een klusje gaan worden in 2017



Al diverse punten van de lijstjes af kunnen strepen deze week voordat de stucadoor Roy Snijders in 2017 komt. 2 kamers op de bovenverdieping zijn inmiddels helemaal leeg en klaar voor het stucen. Hopelijk dat deze week de rest van de bovenverdieping klaar komt voor de stucadoor

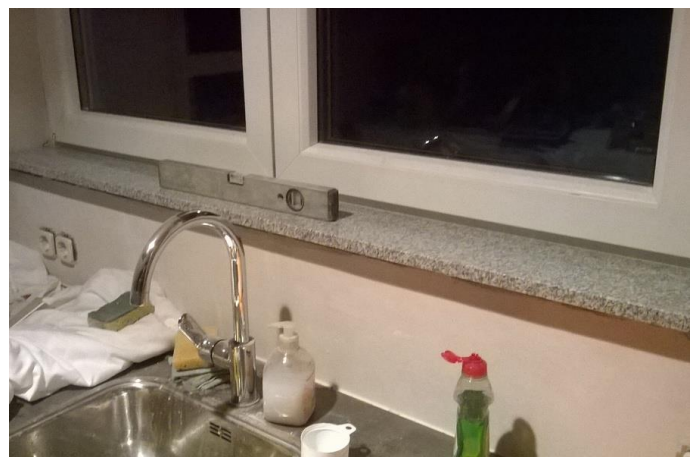


31 December 2016

De aansluitingen van de toilet zijn deze week in de kelder afgemaakt. In 2017 moet er alleen nog dingen worden afgekit en de plafond worden hersteld en dan is er weer een ruimte klaar



Voordat alle gaten in de meterkast dicht worden gemaakt voor de zekerheid maar 4 lege buizen gelegd voor in de toekomst de kabels van de zonnepanelen, internet en tv in te leggen

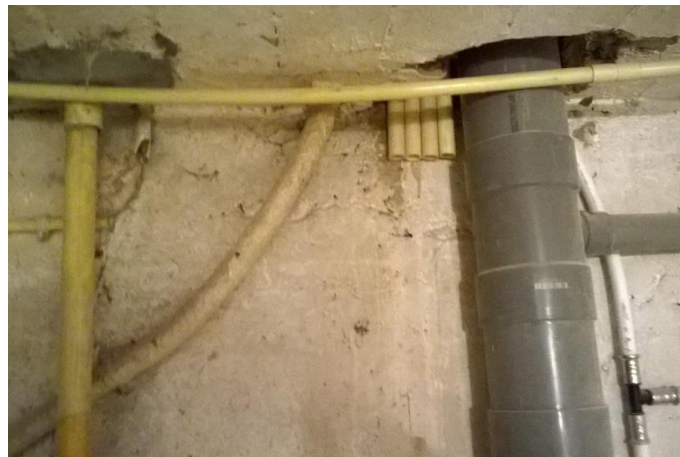

De buis met de kabel van de thermostaat ingekapt en gedeeltelijk al weer dichtgesmeert



De verwarming is deze week op de zolder en 1ste verdieping klaar gemaakt nu de begane grond en kruipruimte/kelder nog




De kamers op de 1ste verdieping zijn nu allemaal klaar voor in 2017 te worden gestuud



Op de laatste dag van 2016 nog even wat losse stucwerk in de gang weggehaald



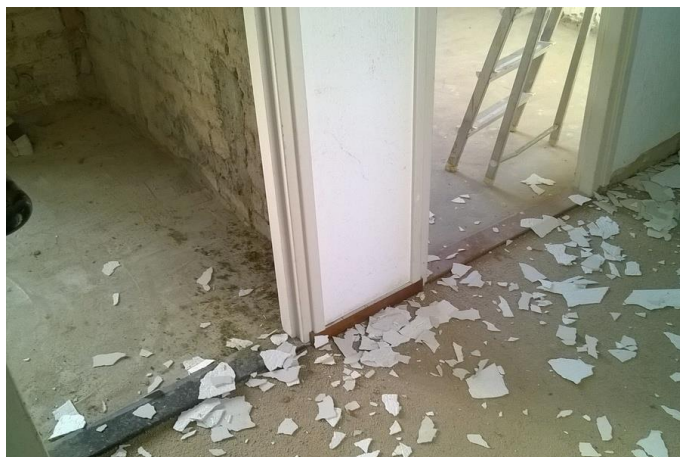

De vensterbank in de woonkamer achter is deze week ook vastgelegd



In de keuken het onderste gedeelte van het nieuwe stucwerk weggehaald en de rest van het stucwerk erboven komt ook geheel los. In 2017 even bekijken met de stucadoor wat het verstandigste is om te doen met dit stucwerk



Het ijzerenframe in de kelder uitgemeten en de beton weggehaald. en zit nu strak in de verf en zal volgende week als het droog is vastgezet worden zodat er kan worden gekeken voor een deurtje erin te gaan maken



Alles staat weer startklaar om ook in 2017 te worden gebruikt

