

# Mei 2016

## 7 mei 2016

Deze week een beetje vooruitgang geboekt met het asbest project. Zelf even gebeld naar de gemeente om de stand van zaken aan te horen en bleek niet alles te kloppen zoals het steeds werd verteld. Maar nu is er wel vaart ingekomen. Woensdag is de steiger geplaatst en de dakpannen eraf gehaald als alles goed gaat wordt komende dinsdag na bijna 5 maanden wachten toch de asbest weggehaald. Aan de binnenkant nog een stukje opgemetseld zodat er volgende week een beugel kan worden geplaatst om de nokbalk te ondersteunen



De oude muur van de badkamer is deze week ook helemaal weggehaald en de stenen weer schoon aan het maken om de muur bij de muurkast weer op te metselen



Nog even op de valreep een groot gedeelte van de oude badkamervloer eruit gehaald zodat volgende week als iedereen op het dak zit, alles kan worden uitgehaald en misschien de boel kan worden geegaliseerd zodat alles op een hoogte komt



## 11 mei 2016

maandag morgen 9 mei zijn de jongens van Arend van der meer geweest de schoorsteen te renoveren. Tevens is er een inspectie geweest voor het verwijderen van de asbest Er waren nog enkele punten die nog moesten worden uitgevoerd voor ze dinsdag willen komen.

Dinsdagmorgen 10 mei om 10 voor 8 piep piep piep kwam de container eraan.

Even later was de hele straat vol wagens van linisol. en heb ik de werklui sterke gewenst en vertrokken richting sittard om even lekker een paar uurtjes te gaan werken.



half 3 begint het voor de zoveelste keer te regenen maar nu wat harder. snel gaan kijken maar zijn nog steeds bezig. Om 3 uur zou inspectie komen en dan als alles goed is wordt dan alles vrijgegeven

Half 4 terug gaan kijken inmiddels is het een hele invasie er staan busjes en auto's overal van linisol, inspectie en dakdekkersbedrijf arend van der meer. De inspectie moet nog plaatsvinden en dan komt de grote vrachtwagen om de container op te halen ook al aanrijden. buurtbewoners hebben in elk geval wel sensatie in de straat.



De inspecteur geeft eerst het voorste gedeelte van het huis asbest vrij zodat de dakdekker die ondertussen al met 4 personen is gekomen kunnen beginnen omdat er weer donkere wolken op komen en snel alles voor de regen kunnen dicht maken. Na een kwartiertje wordt ook het achterste gedeelte asbest vrij verklaart en worden de zwarte gele linten weggehaald. Ondertussen hebben de asbest jongens zich in de unit gedoucht en omgekleed de unit wordt weggereden en gelijk komt de vrachtwagen de container met asbest ophalen en verspreid de hele karavaan met wagens zich en wordt er begonnen met het zagen en vastzetten van de platen.



Omdat het laat is snel frietjes met een snack gehaald en zijn de dakdekkers tot kwart over 8 doorgedaan zodat het huis weer waterdicht is alleen de aanbouw is nog een gedeelte open. Na even een biertje te hebben gedronken zijn ze om half 9 vertrokken.



11 mei vanmorgen naar het huis gegaan en de dakdekkers waren al volop bezig en hadden een gedeelte panlatten al erop zitten. Het was erg warm vandaag op het dak dus regelmatig wat drinken gegeven. Aan het einde van de dag plastic gesponnen omdat er hagel en regen wordt verwacht in het zuiden van het land. Morgen wordt er verder gegaan en zoals de planning er nu uit ziet komt vrijdag de kraan voor het hijsen van de dakkapel





## 13 Mei 2016

in verband met een extra verlofdag morgen nu maar even een berichtje over de laatste 2 dagen

Donderdag zijn de jongens van Arend van der Meer weer verder gegaan met het dichtmaken van het dak. Het dak bij de bijbouw hebben helemaal nieuwe pannen erop gelegd dit was mooier om het gehele dak te vernieuwen om dat het kleurverschil te groot is. Even een handje meegeholpen met de pannen aan te geven zodat het wat sneller ging en iedereen uit de warme zon kon Binnen in de aanbouw het voorraadkastje opgehangen en de gordijnen. De 3 bokjes uitgezet en een osb plaat opgelegd zodat de magnetron koffiezetapparaat en de waterkoker nu een vaste plaats heeft gekregen



Oei vrijdag de 13de wat zal er vandaag gaan gebeuren HEEEEEEEL Veel. Om 10 over 11 kwam de kraan van mammoet er al aan voor het ophijsen van de dakkapel

Nog geen half uurtje later was de klus geklaard en kon er worden begonnen aan de afwerking van de dakkapel



# 21 mei 2016


Een kort weekje in verband met pinksteren maar wel een weekje met heel veel km's

Dinsdagmorgen komen de dakdekkers van Arend van der Meer erachter dat de nieuwe pannen die vorige week op de bijbouw zijn gelegd een iets andere golf hebben dan de oude en passen niet op het oude dak om het stuk van de voormalige schoorsteen dicht te leggen. Naar de pannenfabriek in Susteren gegaan met een oude pan. Het antwoord was kort maar krachtig "Meneer dit is een oud model die hebben we niet meer". Dan maar op internet kijken 2 adressen in Noord-Brabant. Woensdag naar Eersel gegaan daar aangekomen was de kleur niet goed dus zonder resultaat weer terug naar huis. S'avond weer op internet zoek zoek zoek nu weer een adres gevonden net onder Arnhem geen gehoor Donderdag nacht ineens positief bericht. Alleen nu was het probleem dat de aanhanger vol met puin lag. Vrijdagmorgen kwart over 7 puin gelost bij Dirix en daarna gelijk door de pannen halen. De jongens van Arend van der Meer hebben s'middags de ontbrekende kantpannen en eindnokpan erop gelegd.

De 3de muur in de bijbouw nu geheel weggehaald inclusief de deurkozijn



Woensdagmiddag is de meterkast geheel vervangen en besloten niets aan te sluiten en tijdelijk te gaan werken met verlengkabels om zo alle kabels eruit te kunnen trekken en vervangen

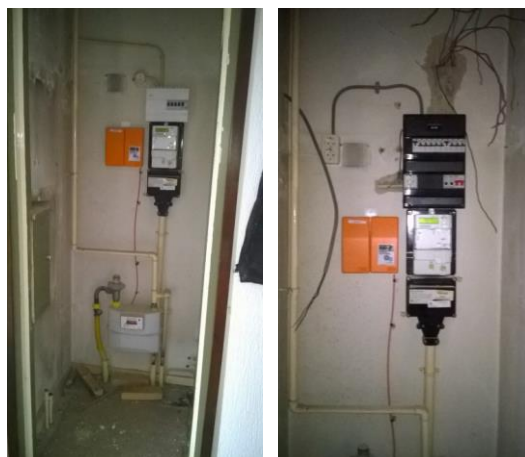

de vloerbedekking in de slaapkamer achter eruitgehaald. Deze kamer is nu klaar voor het infrezen van de stroom- en waterleidingen



Omdat deze week enkele bezoekers zijn komen kijken naar de dakkapel. En bijna het trappegat af donderde. Mijn creativiteit laten borrelen wat doe je met oude planken van de plafonds en de glazenmuur van de oude badkamer. Na ruim 1 dag is er al een mooi resultaat. Volgende week verder maar de afwerking met witte eiken laminaat zal pas worden gedaan voor de kerst





## 28 Mei 2016

Een weekje met diverse kleine klusjes gedaan waar niet overal een kiekje van is gemaakt. Wel weer een muurtje gevonden om te slopen die de 2 kruipruimtes gescheiden houdt. Nu kan ik van voor naar achter onder de gehele woonkamer door



Op zoek gegaan naar de afvoer van de vroegere keuken en binnen een half uurtje kwam de buis al in zicht en blijkt dat een gedeelte van de gresbuis al stuk is



de bovenpunt in de bijbouw helemaal opgemetseld en kan nu uitharden zodat volgende week de rand kan worden afgewerkt



in de toekomstige keuken al wat gaten gemaakt voor de water en electra leidingen



Komende week alle gaten her en der dichtmaken voorbereidingen treffen voor vrijdagmorgen  
Feenstra de spouwmuren komt isoleren

## 31 mei 2016 uitbreiding social media

Na de uitbreiding van het wooncomfort door het plaatsen van een dakkapel is er sinds vandaag een uitbreiding bij de social media en heb ik een eigen YouTube kanaal aangemaakt. Dus nu is het opknappen van de woning niet alleen te volgen via [www.woningopknappertje.nl](http://www.woningopknappertje.nl) Google+ maar ook op YouTube
