


September 2016

3 September 2016

Deze week was het dan zover na heel wat probleempjes en gesprekken werd woensdag de keuken geleverd en donderdag door Rila Keukenmontage geplaatst. Een mooi resultaat alleen de zijkanten moeten de muren op een of andere wijze nog recht worden gemaakt Omdat er nog wat gesloopt moet worden is de keuken nu helemaal afgedekt met lakens om niet te beschadigen

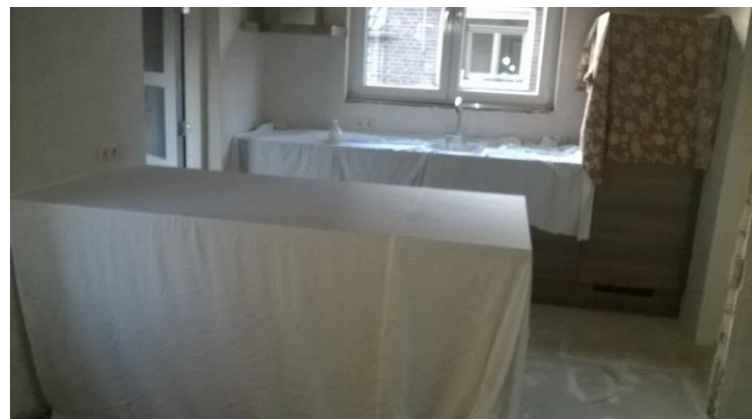

Weer een gedeelte met wat vloeken en tieren van de woonkamer vloer eruit gehaald en vervangen door nieuwe osb platen



Alle hout delen van de vloer en de plafond van de slaapkamer zijn deze week weggehaald en liggen nu 'te wachten op de winter voor in de houtkachel. Tijdelijk is de tuin helemaal leeg toch een behoorlijke oppervlakte . Daar moet snel verandering in komen



De nieuwe lamp opgehangen in de gang boven en al een gedeelte van de plafond dichtgemaakt



De eerste voorbereidingen voor het maken van het tussenmuurtje zijn al klaar het profiel staat waterpas. Nu nog een handlanger vinden voor het binnen leggen van de stenen en dan kan er worden begonnen. Dat zal iets van de komende week zijn tenminste er is weer een extra rustdag ingeroosterd. En de kabouterjes hebben helaas mijn huis nog niet gevonden.




10 September 2016

Begin van de week stond er alleen nog maar een deur en hoe verder de week voorbij ging werd de muur in de bijbouw hoger en hoger en is het nu mooi op hoogte



Ook op verschillende plaatsen wat stenen bijgevoegd zodat de afzuigklep kan worden geïnstalleerd en hopelijk als het weer wat minder warm is de rest kan worden gevoegd zodat dit klusje ook weer van het lijstje kan worden afgestreept

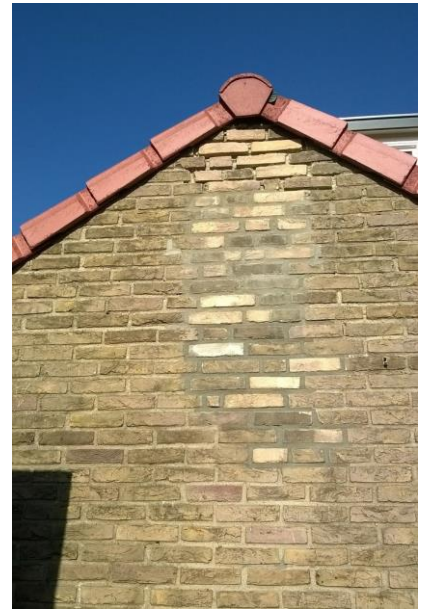

Ook is de loodgieter deze week even binnen gewipt om de aansluiting van het water te maken voor de wasmachine en het warme water voor de badkamer die in te toekomst ook op de begane grond wordt gemaakt. Nu alleen nog de aansluiting in de kelder maken zodat dan ook water in de keuken kan worden gepakt en de vaatwasser kan worden getest. Komende week de leidingen vastleggen en dan kunnen de stopcontacten ook worden geplaatst



de badkamer is deze week weer een stukje verder af gekomen en ligt nu een mooie stenen vensterbank en op de toilet uitbouw ook. nu nog de lamp vervangen het stoeltje ophangen in de douche en de verwarming plaatsen en dan de badkamer grondig poetsen en de deur afsluiten zodat deze ruimte helemaal klaar is



Vanmiddag nog even een emmer knauf gemaakt om de 2 gaten die nog zaten van de badkamer dicht te maken en de leiding vast te leggen bij de voormalige schoorsteen. komende week is de bedoeling deze muur bij de oude schoorsteen te gaan stucen Ik heb een marge van 4 cm uit het lood te werken om een gelijkwaardige wand te krijgen zoals in de keuken. en dat moet zeker kunnen lukken



De koelkast maar een mooi rood handvatje van gemaakt want de eerste vingervlekken van de specie zaten er al op. Mogelijk dat alle handvatten een mooi rood omhulsel krijgen om beschadiging te voorkomen



17 September 2016

Begin van de week werd het tropenrooster weer ingesteld. Zodat de werkvloer om 3 uur werd verlaten en plaats maakte voor het zwembad.

Als het zonnetje weer bijna onder is gegaan het laatste gedeelte van de punt bij de bijbouw gevoegd zodat dit klusje weer kan worden afgestreept



Een begin gemaakt voor het leggen van de nieuwe riolering. En afwatering van het dak van de bijbouw. De afvoer staat nog niet helemaal waterpas maar dat komt wanneer het bovengedeelte mooi op maat wordt gemaakt en vastgezet in de muur



De oude leidingen in de slaapkamer verwijderd en een gedeelte nieuwe gaten gefreesd in de mergel. Even wat cement gemaakt en vast gezet voor de komende week de andere gaten te maken zodat ook deze kamer helemaal klaar is met de electra



De eerste voorbereidingen voor het maken van een gat in de muur naar de kelder is in volle gang. De ijzeren balken zijn nu geheel geverfd en de stenen pilaar die de balk moet gaan ondersteunen staan ook al op zijn plek. Als het niet te warm wordt en alle elektrische apparaten meewerken zal de eerste ijzeren balk deze week worden geplaatst en de eerste gaten naar de kelder worden geboord om daarna de voorbereidingen te treffen om de 2de ijzeren balk te gaan plaatsen.



Een van de laatste sloop projecten is de toilet op de begane grond. Die is enkele weken geleden al voor het grotendeels gestript maar er moesten nog 2 muren de tegels af worden gehaald. Dit ging helaas wat sneller dan verwacht nadat het eerste tegeltje eraf was kwamen de rest van de tegels tegelijk met de specie erachter naar onder met wat kleine schaaf wondjes na is alles goed afgelopen. Mogelijk dat de tegeltjes waren geschrokken van het fluitje van de buurman die de duiven binnen loodste. Nu de rommel opruimen maar dat is iets voor de volgende week en dan is ook deze ruimte klaar voor de grote metamorfose die zal worden uitgevoerd door klusbedrijf Ron Houben





24 September 2016

Op zolder rolgordijnen gehangen om de warmte buiten te houden. Nu kan ook op zolder het lichtplan worden gemaakt als de rolgordijnen dicht zijn. Van buiten uit is het ook goed te zien dat er iets ophangt.



De loodgieter heeft maandag alles in de kelder klaar gemaakt en nu is er ook koud water in de keuken.



Weer een partij gesnoeid en gelijk de wortels uit de grond gehaald in de tuin voor het huis. Alles achter gegooid zodra er wat meer is voor een aanhanger wegbrengen naar het gemeentelager



Het restant van de kalkstenen buiten weggehaald en onder in de kruipruimte gelegd ze waren mooi droog en mogelijk dat ze nog eens nodig zijn en in de kruipruimte heeft niemand er last van



De gaten voor alle stopcontacten op de slaapkamer gemaakt de oude bedrading eruit gehaald en de dozen vastgezet.



De woonkamer een grote poetsbeurt gegeven en alle gereedschap in het nieuwe magazijn in de bijbouw gelegd



De grootste klus deze week was een begin te maken aan het luik dat moet komen vanuit de kelder naar de kruipruimte. Aan de zijde van de kruipruimte is er inmiddels 10cm uitgehammerd en een ijzerenbalk gelegd en in de specie gelegd deze kan de komende weken uitharden en daarna zal er vanuit de kruipruimte een klein boorgaatje worden gemaakt naar de kelder en dan kan er ook vanuit de kelder worden begonnen met het luik en plaatsen van de 2de ijzerenbalk



