


Oktober 2020



10 Oktober 2020

Ook deze maand is er weer veel werk verricht in Ilona's honk. Het einde begint in zicht te komen.

De vloer is inmiddels opgehoogd en de vloertegels liggen er bijna allemaal in

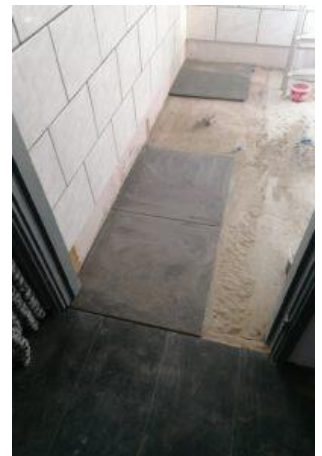



Nu de vloertegels aan de zijkanten liggen kan ook de onderste rij tegels worden gesneden en vast worden gelijmd. Ook de tegels rond het raam zijn inmiddels gezet.



Tussendoor is buiten de tijdelijke damwand geplaatst in de plantenbak zodat de grond kan worden weggehaald en de nieuwe blokken kunnen worden gelijmd zodat de bak weer helemaal dicht is




Na goedkeuring van de boekhouder en er budget is zijn de vloertegels voor in de bijkeuken en keuken ook gekocht en staan in de kelder (project augustus 2021)



Inmiddels is een groot gedeelte van de muren ingevoegd.



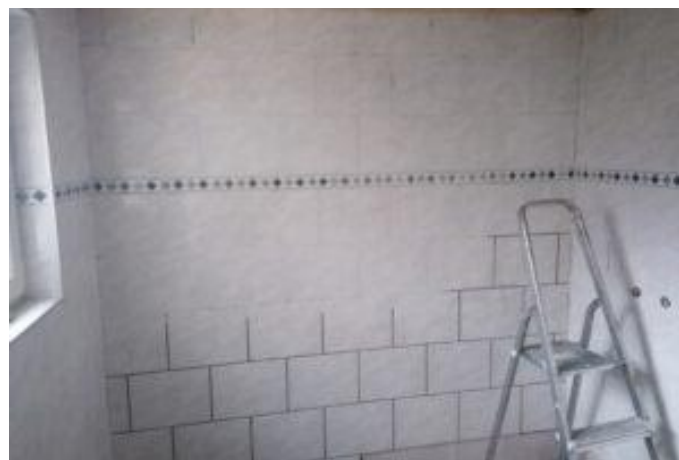

De stenen voor in de douche zijn inmiddels ook gekocht maar kunnen nog niet worden gelegd voor de douchedrain op zijn plek ligt maar door vertraging in de levering ligt dit even stil er is inmiddels wel de afvoerbuis vrijgemaakt waar deze drain op moet worden aangesloten.



Na een week te wachten is de verwarming geleverd maar de vreugde was van korte duur omdat deze beschadigd was en er een nieuwe moet worden geleverd en deze is ook nu niet op voorraad.



Oktober HALLOWEEN dus het raam moet er ook dit jaar weer aan geloven en is inmiddels het spinnenweb met in totaal ruim 30 meter gepunnikte draad klaar

