

November 2020



7 November 2020

De grote vloertegels liggen er nu helemaal in en zijn inmiddels ook gevoegd. Alleen de kleine stroken in het douche gedeelte moeten nog worden gelegd maar dit ligt even stop omdat niet alle materialen aanwezig zijn




Zoals in het bericht van 10 oktober geschreven stond moest er een nieuwe radiator worden geleverd omdat deze beschadigd was. ! week later werd de nieuwe radiator geleverd en ook deze was weer beschadigd en moet voor de 3de keer een nieuwe radiator worden geleverd maar nu door een andere transporteur. En JIPIE 3x is scheepsrecht die was goed en zit inmiddels tegen de muur en is aangesloten.



De rest van de muur is zover als mogelijk gevoegd. Het laatste gedeelte kan pas als de drain en stroken vloertegels liggen.



Nu de muren zijn gevoegd kan de afwerking beginnen en is er inmiddels een groot gedeelte van de randen gekit en de kranen zijn gemonteerd en lekken tot nu toe niet

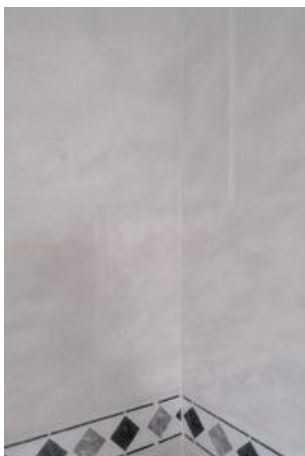

De wasmachine en droger staan inmiddels ook op zijn plek.



De eerste proef met de wasmachine is inmiddels ook al een feit.




Nu alle grote machines in Ilona's honk staan is ook de deur aangepast en zit er weer netjes in.



Wasmachine en droger uit de kamer Groene planten weer in de kamer.



Ook is inmiddels de plafond bijna helemaal klaar

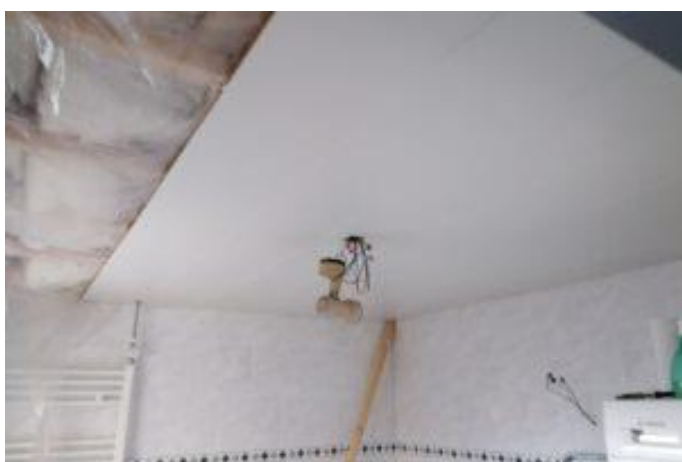



Maar niet alleen in Ilona's honk is deze maand gewerkt omdat het zo lekker weer was is er ook in de tuin gewerkt en inmiddels de grond weggehaald bij de oude bloembak en inmiddels al een gedeelte zand in gestort voor het leggen van de tegels.



De teelaarde ligt nu onder de plastic op de oprit en wie hem nodig heeft kan deze gratis komen ophalen.



Op de valreep vandaag nog even te spikes weer vastgezet boven de deur. Deze waren losgekomen na het testen om over de deur te klimmen. Een echte aanrader het werkt prima en zijn pijnlijk.

