

# November 2016

## 10 November 2016

Afgelopen maandag een e-mail uit Turkije ontvangen van de makelaar. Ondertussen is deze vertaald. Helaas gaat de koop niet door wel heeft de makelaar iets anders gevonden waar ik mogelijk wel interesse in zou kunnen hebben maar dan moet ik gaan kijken. Op dit moment laat het mijn gezondheid niet toe om af te reizen naar Turkije om het pand te gaan bekijken en heb dit per mail laten weten.

Zodra ik weer kan lopen en mijn gezondheid het toelaat en wat vrije dagen heb zal ik de draad weer oppakken

## 19 November 2016

Helaas is er nog niet veel verbetering in mijn herstel en ben nu overgestapt op plan B en verschillende werkzaamheden uitgegeven aan derden. Zodat er toch iets gebeurt in het huis en de abonees op deze website toch op de hoogte blijven



Zo is de verwarming in de badkamer opgehangen en hebben ze de vloer op de zolder weer dichtgemaakt zodat daar ook volgende week kan worden begonnen aan het leggen van de verwarmingsleidingen



Ook de electricien is de sleutel komen halen en de meterkast bijna alle groepen aangesloten en op diverse plekken in het huis voorzien van lampen en stopcontacten zodat alle verlengsnoeren voorlopig kunnen worden opgeborgen



Ook heeft deze week Klussenbedrijf Ron Houben met zijn team weer de draad opgepakt en begonnen aan de toiletruimte op de begane grond. met eerst wat tegenslagen dat er te weinig vloertegels zouden zijn. Is er met de tegelzetter besloten om de diverse vloertegels die er waren te combineren zodat het toch mooi symmetrisch uitkwam. Voor de zekerheid zijn er ook nieuwe wandtegels gehaald zodat er zeker genoeg waren

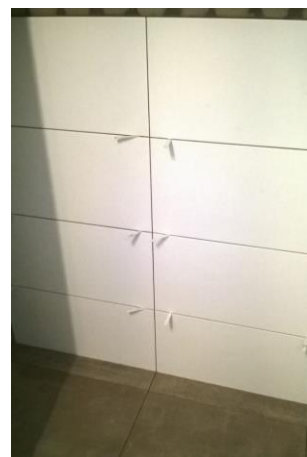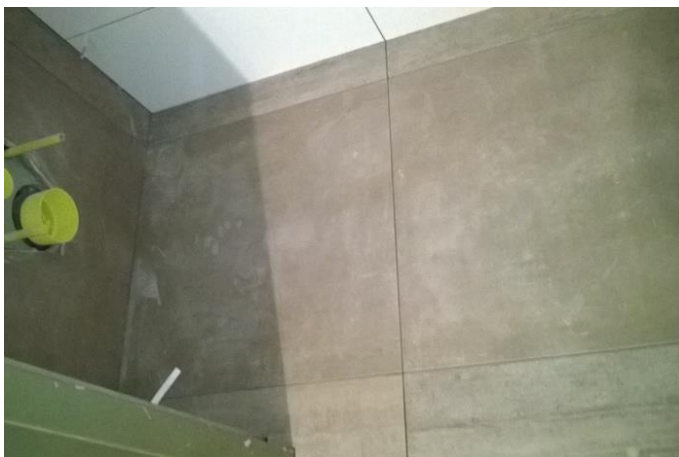

# 26 November 2016

Ook deze week weer alle werkzaamheden uit handen gegeven met als enige verschil dat ik nu af en toe met de fiets naar het huis ga kijken omdat het een goede oefening is voor mijn rug.

Begin van de week zat er een verbetering in maar de laatste 2 dagen is het weer een stukje achteruit gegaan en weer veel last van het bovenbeen.

Deze week zijn er ook verschillende projecten die stil zijn komen te liggen zoals de wc op de begane grond en helaas is er ook deze week geen begin gemaakt aan de verwarmingsinstallatie. De stucadoor zou deze week ook nog een afspraak maken voor te komen kijken wat er allemaal moet gebeuren en een offerte maken

Al deze genoemde dingen gaan hopelijk de komende week wel wat vooruitgang boeken anders zal plan B in werking gaan

Wel zijn de tegels voor boven de aanrecht binnengekomen en zijn ze op proef opgesteld om de kleur te bekijken nu nog kijken wat de kosten zijn om deze door een tegelzetter te laten zetten



Op de computerkamer is de tussenwand opgevuld met tempex en een laagje plastic om de kou van zolder zoveel mogelijk boven te houden

