

Maart 2023



11 Maart 2023

De temperatuur was boven 0 en gelijk de beton gemaakt en de 3 palen met de daarin de haken gestort. Nadat de beton uitgehard is de kiezel weer erover heen . De haken zijn ontkoppelbaar gemaakt zodat de eindstop erop zit onder de kiezel.







Omdat na de laatste bijeenkomst nog steeds geen antwoorden komen over de afwatering. Zelf de knoop doorgehakt en een begin gemaakt voor de nieuwe afwatering. Net onder de oprit de aansluiting blootgelegd en de afwatering tot aan de oude dakgoot gelegd en vastgezet.





Inmiddels is er ook een opdracht gegeven bij Arend van der Meer voor het omhangen van een nieuwe zinken dakgoot en aansluiten.

Net voor het einde van het jaar nog een stopcontact gemaakt maar nog niet aangesloten aan de onderzijde van het afdak ter voorbereiding van het opknappen van het afdak in het voorjaar.





In de meterkast ligt de kabel van het stopcontact onder het afdak maar moet nog worden aangesloten maar nog even over nadenken of het rechtstreeks op het net word aangesloten of via een aparte schakelaar.



In de kast van de verwarmingsketel een rekje voor wat opbergruimte van voorraad lampen en stekkerdozen gemaakt en de achterzijde met hdm platen afgewerkt.



Omdat met het koude weer de steen bij de voordeur glad is een aparte mat gekocht met aluminium strippen. Met een zaag de breedte op maat gemaakt en het reststuk past netjes in de kelder op de laatste trede.





Omdat het buiten koud en sneeuwt worden enkele binnenklusjes die al langer op planning staan en in de vergeethoek beland waren weer opgepakt.



Na wat tegenslag (warm en koud water verwisseld) en lekkage van de wasbak is deze inmiddels ook vastgezet en in gebruik genomen.



Op de badkamer op de begane grond het stopcontact en schakelaar na 2 jaar aangesloten zodat er kan worden geshopt voor een lamp.



Ook een mooie opbergplek van de weegschaal gevonden en met wat hout en aluminiumprofielen nu netjes opgeborgen en hoeft de weegschaal niet meer voor het dweilen worden opgepakt van de grond.



In januari is het hele huis van kruipruimte tot en met zolder door Nick van het bedrijf Endule opgemeten en bekeken voor het maken van een woonplan en energielabel. Dat in maart klaar is.

Een advies was onder andere om de binnenmuur van de kelder naar keuken en de trap te isoleren. Bij de isolatiehal in Helmond platen pir 60 mm gehaald. De muur aan de keukenzijde is geïsoleerd.



Om de platen netjes af te werken de oude laminaat van de (bij)keuken van zolder gehaald en ertegenaan gezet. Inmiddels is deze muur op de afwerking van de randen na klaar.





De 2de muur aan de keukenzijde is wel de isolatie geplaatst maar nog niet afgewerkt.



Het kleine muurtje aan de zijkant van de trap is ook al geïsoleerd en afgewerkt met de laminaat.



Boven de plafond 80 mm glaswol gelegd en netjes afgewerkt met een overblijfsel laminaat van zolder.



De gang een beetje opgefleurd met een gekleurd kunstwerk van John



Ook is de kleine bankschroef vervangen door een oudere, stevigere en groter exemplaar.



Tussen alle werkzaamheden door was er ook nog carnaval waarbij dit jaar nog extra werk was voor het versieren van een 2de woning. En de première van de nieuwe vlag.






De trap staat ook in planning om te isoleren maar in een dunnere maat. Door een klein ongevalletje met het maken van het plafond bij de keldertrap zal dit even wat later worden.



Het servies is verhuisd van de kelder naar de garage en inmiddels de gordijnenrooi geplaatst. Ook het gordijn is inmiddels klaar en hangt

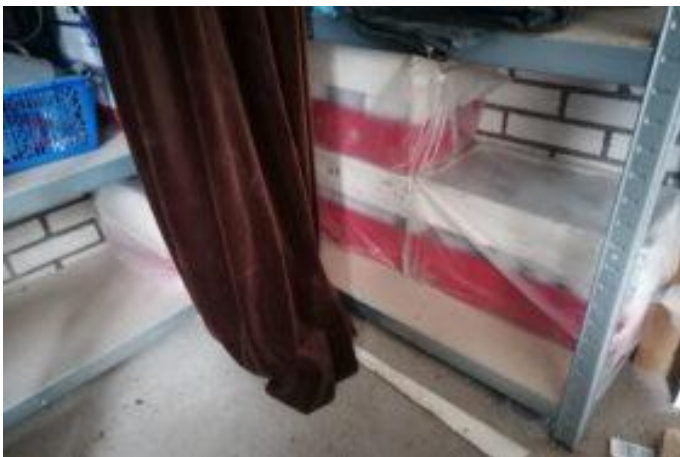



Omdat het bestek los in de bakken lag van 100mm buis en deksels kokers gemaakt zodat dit netjes bij elkaar blijft en niet vies word.



Ook een koker gemaakt van 40mm buis voor de veren van de prinsensteek op te bergen en op te hangen.



Een afdekplaatje gemaakt dat wel past op het stopcontact dat langer is en zo netjes uitziet.



Als we toch bezig zijn in het trappengat van de kelder dan ook maar een koof maken voor om de elektra en waterleiding.





De 2de lading pir platen opgehaald in Helmond om een begin te maken aan het isoleren van de onderzijde van de trap.



Alle rechte platen die aan de stootborden komen zijn al op maat gemaakt en genummerd en kunnen op korte termijn worden vast gekit.



In het keldermagazijn locatie Mam nog een restpartij wandtegels gevonden en samen met de restpartij wandtegels in mijn eigen magazijn. Zal het stukje muur waar geen isolatie zit in de kelder tussen de trap en de koof worden betegeld.

